


日吉駅西口側の工事日程

令和7年12月12日時点

現場案内図

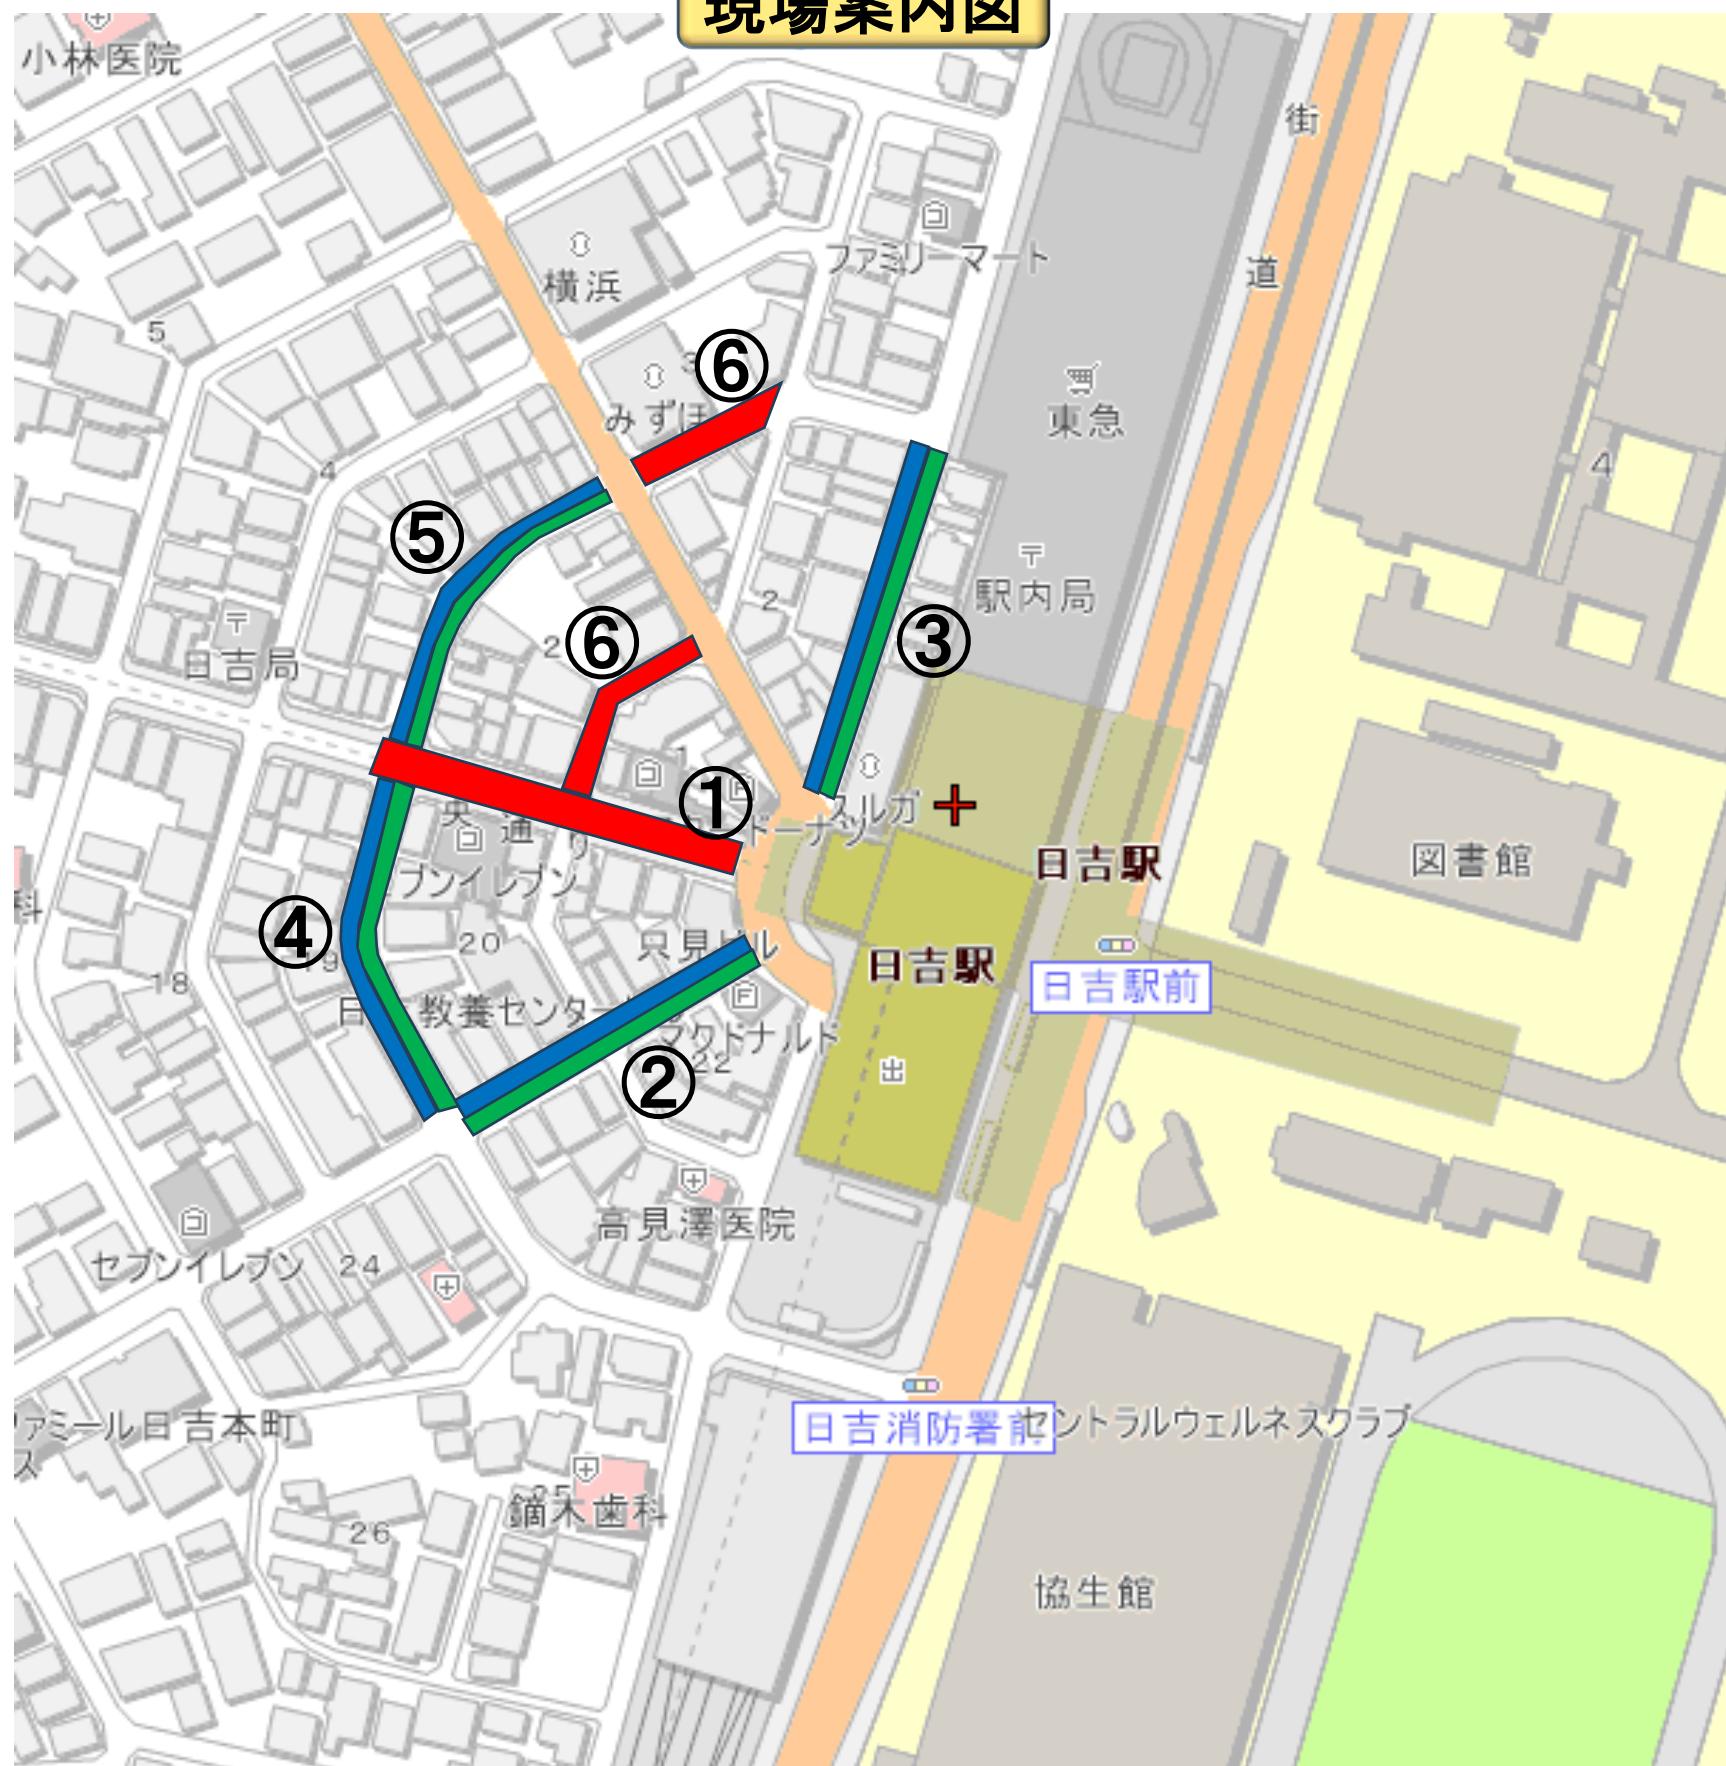

工事日程

舗装工事 夜間施工となります。

路線②: 12月8日(緑)、12月9日(青)

路線①: 12月10日

路線③: 12月11日(緑)、12月12日(青)

路線⑥: 12月15日

路線④: 1月以降予定(緑)(青)

路線⑤: 1月以降予定(緑)(青)

※路線②③④⑤は、車道の半分ずつを施工します。

区画線工事 昼間施工となります。

路線②: 12月17日→作業完了後、一方通行化

路線③: 12月18日→作業完了後、一方通行化

路線①: 12月19日→作業完了後、一方通行化

安全施設設置工事 昼間施工となります。

路線②・③: 12月18日以降

作業時間

昼間施工: 9時~17時

夜間施工: 24時~6時

※現場状況等により、多少時間が前後すること
があります。

※工事日程については、天候や現場状況の影響で
変更となる場合があります。
