

# 工事進捗状況



## 青葉区下谷本地区 橋梁工事・函渠工事・擁壁工事

- ・横浜青葉IC付近の首都高施工区間では、上部工の架設工事を進めています。
- ・横浜市施工区間の橋梁工事では、上部工の架設工事が完了し、壁高欄の施工を進めています。




## 都筑区川向地区 橋梁工事

- ・H30.1.13及び1.20に県道川崎町田を通行止めて、ユニットキャリアによる上部工の架設を行いました。
- ・横浜市施工区間では、上部工の架設工事が完了し、壁高欄の施工を進めています。
- ・横浜港北JCT付近の首都高施工区間では、上部工の架設工事を進めています。

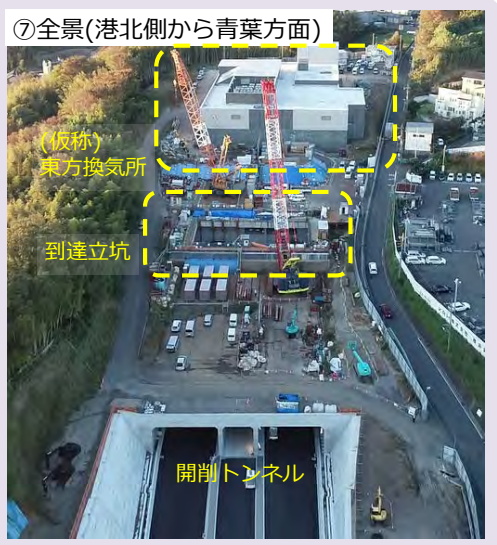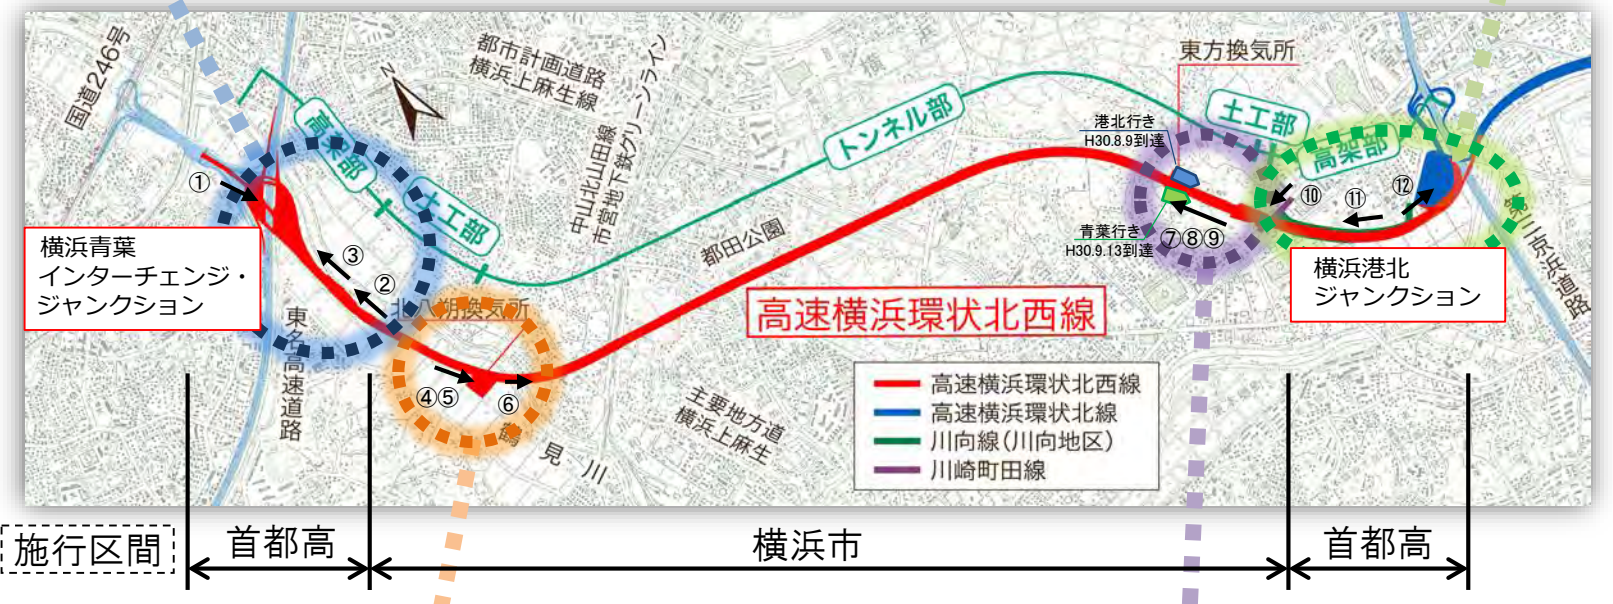

## 緑区北八朔地区 U型擁壁・開削トンネル・発進立坑・換気所・シールドトンネル工事

- ・H29.3.27にシールドマシン発進式を開催後、トンネルを約3.9km掘り進め、8月9日に港北行き(首都高施工)のシールドマシン、9月13日に青葉行き(本市施工)のシールドマシンが無事到達しました。(H29.3.30首都高シールドマシン発進、H29.5.9横浜市シールドマシン発進)
- ・(仮称)北八朔換気所の建設工事では建築工事が完了し、設備工事を進めています。

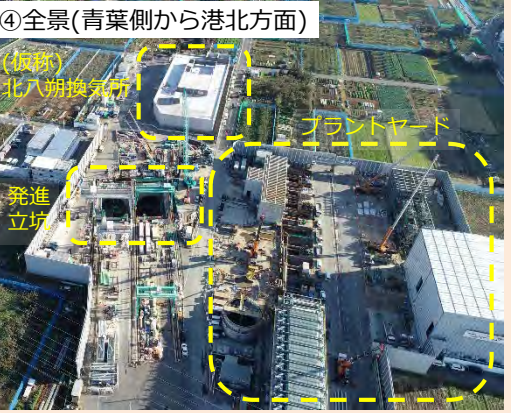

## 都筑区東方地区 換気所・到達立坑・開削トンネル

- ・開削トンネルでは、躯体の築造、埋戻し、トンネル内の付帯工事が完了しました。
- ・到達立坑では、港北行き及び青葉行きのシールドマシンが到達しました。シールドマシン到達後は、マシンの解体を進めています。
- ・(仮称)東方換気所の建設工事では建築工事が完了し、設備工事を進めています。



シールドトンネル進捗状況  
港北行(首都高施工): 8月9日到達  
青葉行(横浜市施工): 9月13日到達
