

## 特定事業の進捗状況

### 1 基本構想の評価等

バリアフリー法 25 条の 2 では、「市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね 5 年ごとに、当該基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努める」とされています。

横浜市では特定事業の進捗状況を把握するため、毎年調査を行うこととしており、令和 3 年 3 月時点の進捗状況について調査をしました。

なお、1 巡目の戸塚駅周辺地区及び星川駅周辺地区の特定事業は、調査の対象外としています。（2 巡目で引き続き特定事業として位置付けたものは、2 巡目の進捗率にカウントしています）

### 2 進捗状況結果（令和 3 年 3 月現在） ※表-1、表-2 参照

横浜市は、特定事業の整備目標年次を、基本構想策定からおおむね 5 年後としています。


整備目標年度を経過した関内駅周辺地区から市が尾駅周辺地区までの計 15 地区の特定事業の進捗率は約 80%、整備目標年度に達していない地区も含めた全 18 地区の進捗率は約 70%です。

内訳をみると、ほとんどの事業が完了している地区もある一方で、整備目標年度を経過しても未完了事業が多く残っている地区もあります。

特定事業別で見ると、道路特定事業は他事業と比較して未着手事業の割合が高いですが、道路特定事業の事業数は、全事業数の約半数を占めており、事業数が多いことも進捗が遅れている理由の一つであると考えられます。

未完了事業で進捗が進まない主な理由としては、予算の確保に関するものが多く見受けられました。エレベーターの改修や、通路の有効幅員の確保など、大規模なものや外部の影響を受ける事業は、他事業と比較して早期の対応が難しいことが分かりました。一方で、階段の段鼻の明示や、視覚障害者誘導用ブロックの改修など、既存設置物の改善、改修は早期に取り組まれていることから、工事費が比較的安価な事業や、事業者が単独で実施できる事業は、完了となっている傾向にありました。

表-1 各地区の特定事業の進捗状況

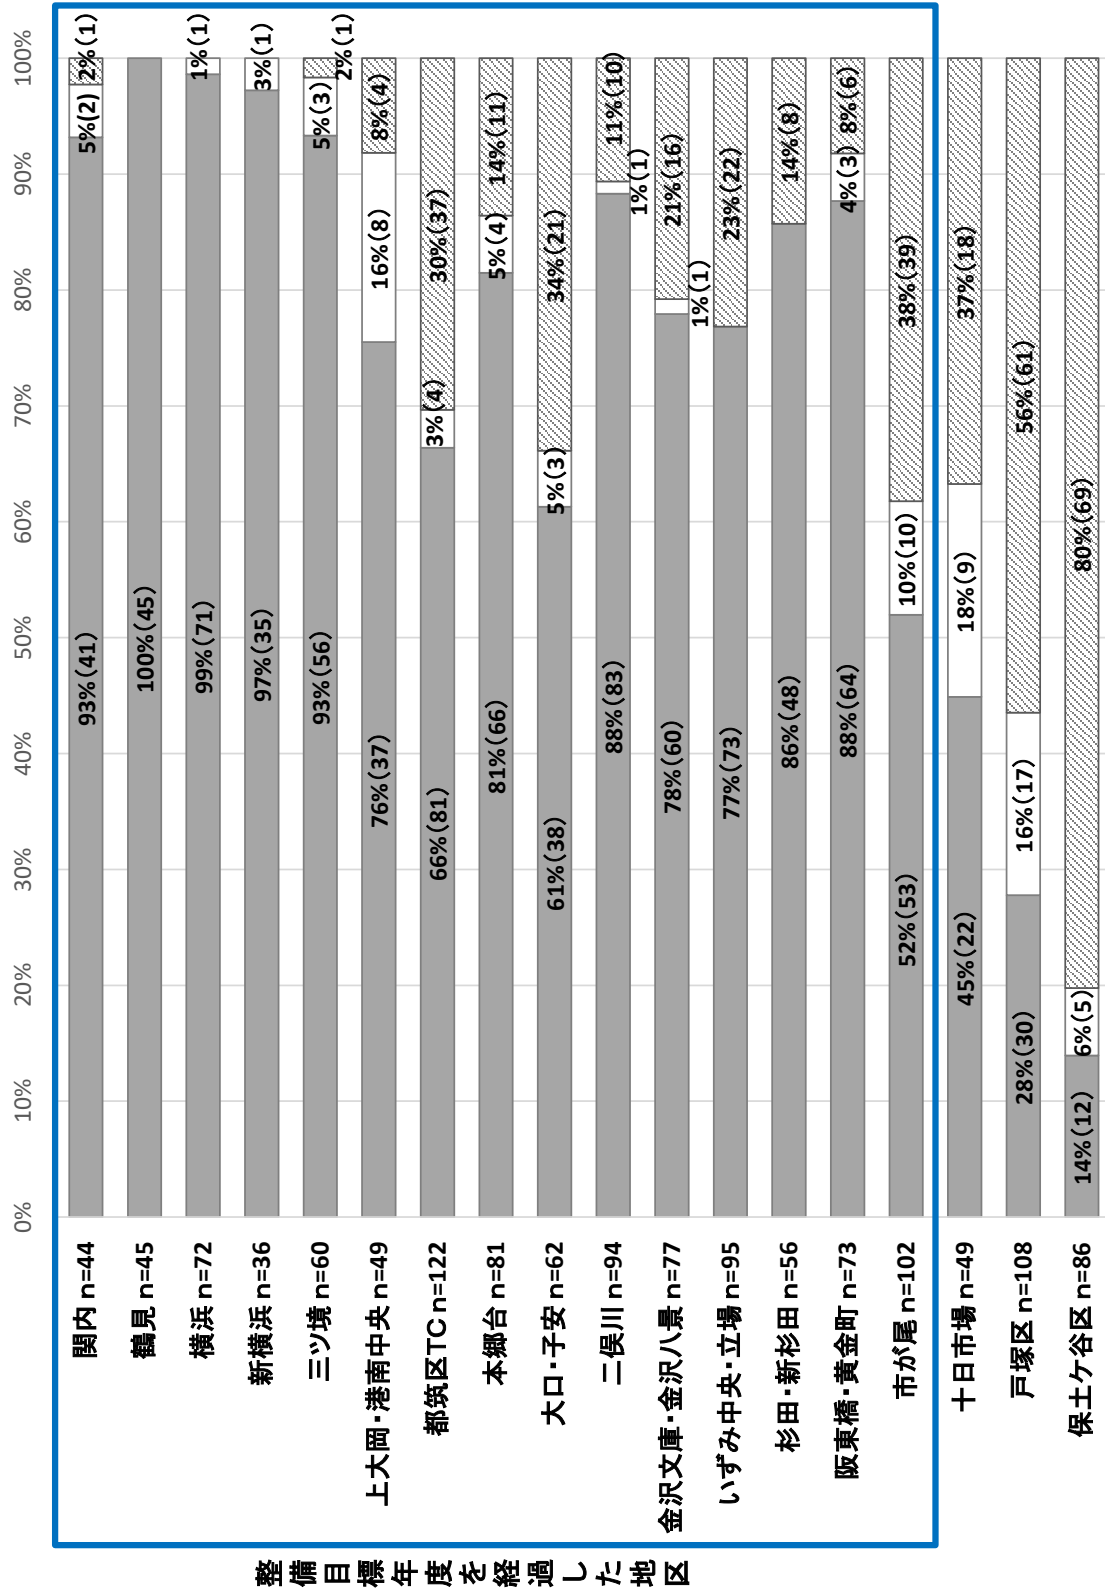

■ 完了 + 継続中 □ 実施中 ▨ 未着手  
 ※ %の後の( )の数字は事業数  
 ※ 単位未満を四捨五入しているため  
 ※ 合計が100%にならない場合がある

表-2 各地区の特定事業の進捗状況（事業別）

事業	地区	整備目標年度を経過した地区															整備途中の地区			15地区 合計	3地区 合計	18地区 合計
		関内	鶴見	横浜	新横浜	三ツ境	上大岡・ 港南中央	都筑区 TC	本郷台	大口・ 子安	二俣川	金沢文庫 金沢八景	いずみ中央 ・立場	杉田・ 新杉田	阪東橋・ 黄金町	市が尾	十日市場	戸塚区	保土ヶ谷区			
		中区	鶴見区	西区	港北区	瀬谷区	港南区	都筑区	栄区	神奈川区	旭区	金沢区	泉区	磯子区	南区	青葉区	緑区	戸塚区	保土ヶ谷区			
		策定	H16.8	H16.8	H18.8	H18.8	H19.3	H20.5	H22.5	H23.8	H23.12	H24.5	H25.3	H25.3	H26.3	H27.3	H28.3	H29.3	H30.11			
整備目標	H22	H22	H22	H22	H22	H22	H26	H28	H28	H29	H29	H29	H30	H31	R2	R3	R5	R6				
公共交通	事業数	11	14	29	15	21	29	19	6	8	14	3	34	9	15	11	2	20	9	238	31	269
	完了+継続中◎	10	14	28	15	17	19	15	3	7	12	3	30	7	13	10	2	11	0	203	13	216
	実施中 ○	1	0	1	0	3	8	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	18	4	22
	未着手 △	0	0	0	0	1	2	2	1	0	2	0	4	2	2	1	0	7	7	17	14	31
	進捗率	91%	100%	97%	100%	81%	66%	79%	50%	88%	86%	100%	88%	78%	87%	91%	100%	55%	0%	85%	42%	80%
道路	事業数	27	19	29	15	32	16	53	32	39	34	35	35	24	41	57	30	58	35	488	123	611
	完了+継続中◎	26	19	29	15	32	14	27	23	21	29	26	18	21	36	18	5	6	0	354	11	365
	実施中 ○	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7	8	12	1	10	21	31
	未着手 △	1	0	0	0	0	2	26	8	18	5	9	17	3	3	32	17	40	34	124	91	215
	進捗率	96%	100%	100%	100%	100%	88%	51%	72%	54%	85%	74%	51%	88%	88%	32%	17%	10%	0%	73%	9%	60%
交通安全	事業数	1	1	1	1	1	1	7	4	1	1	1	6	6	7	8	3	7	2	47	12	59
	完了+継続中◎	0	1	1	0	1	1	7	3	1	0	0	6	5	6	7	3	4	1	39	8	47
	実施中 ○	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	7	1	8
	未着手 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	3	4
	進捗率	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	75%	100%	0%	0%	100%	83%	86%	88%	100%	57%	50%	83%	67%	80%
都市公園	事業数							18	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	4	23	4	27
	完了+継続中◎							12	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	16	2	18
	実施中 ○							0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
	未着手 △							6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	7
	進捗率	—	—	—	—	—	—	67%	—	0%	—	—	—	100%	—	—	—	—	50%	70%	50%	67%
建築物	事業数							22	34	10	35	22	20	9	3	16	9	17	36	171	62	233
	完了+継続中◎							17	32	7	32	15	19	7	2	9	9	8	9	140	26	166
	実施中 ○							2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4
	未着手 △							3	2	2	3	7	1	2	1	6	0	9	27	27	36	63
	進捗率	—	—	—	—	—	—	77%	94%	70%	91%	68%	95%	78%	67%	56%	100%	47%	25%	82%	42%	71%
その他	事業数	5	11	13	5	6	3	3	5	3	10	16	0	4	7	10	5	6	0	101	11	112
	完了+継続中◎	5	11	13	5	6	3	3	5	2	10	16	0	4	7	9	3	1	0	99	4	103
	実施中 ○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	4	5
	未着手 △	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	4
	進捗率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	—	100%	100%	90%	60%	17%	—	98%	36%	92%
全体	事業数	44	45	72	36	60	49	122	81	62	94	77	95	56	73	102	49	108	86	1068	243	1311
	完了+継続中◎	41	45	71	35	56	37	81	66	38	83	60	73	48	64	53	22	30	12	851	64	915
	実施中 ○	2	0	1	1	3	8	4	4	4	3	1	1	0	3	10	9	17	5	41	31	72
	未着手 △	1	0	0	0	1	4	37	11	21	10	16	22	8	6	39	18	61	69	176	148	324
	進捗率	93%	100%	99%	97%	93%	76%	66%	81%	61%	88%	78%	77%	86%	88%	52%	45%	28%	14%	80%	26%	70%
