

上 令 水	下 和	水 8	道 年	交 9	通 月	委 1	員 5	会 日	局
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

横浜水道中期経営計画（令和6年度～9年度）の 令和7年度の進捗状況について

1 横浜水道中期経営計画について

横浜水道中期経営計画（以下「本計画」という。）は、横浜水道長期ビジョン（以下「長期ビジョン」という。）で掲げる「暮らしとまちの未来を支える横浜の水」を実現するための4年間の実施計画です。

本計画（令和6年度～9年度）では、将来を見据えた水道システム再構築による施設の最適化、効率的・効果的な執行体制の構築や業務効率化による運営体制の最適化など、「水道事業の最適化」に向けて事業を推進し、持続可能な事業運営を目指すこととしています。

なお、本計画の実現に向けては、6つの施策目標を掲げ、目標達成に必要な事業を推進しています。

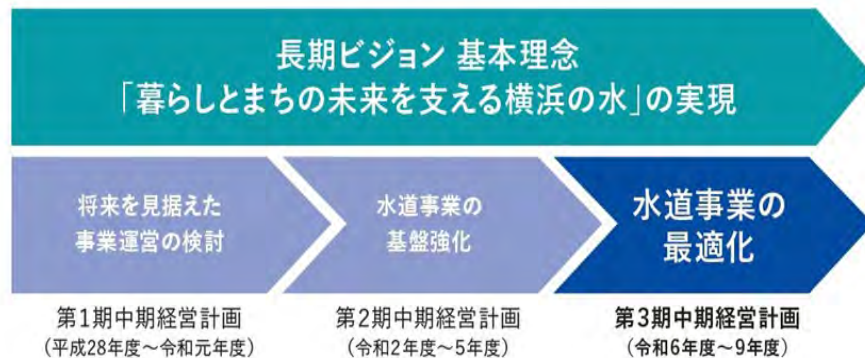


図1 長期ビジョンと中期経営計画の構成




図2 本計画の施策目標

2 本計画（令和6年度～9年度）の主要事業等の進捗状況

各施策目標には、計画期間の4年間の目標値を示す指標と、施策を進めるための44の主要事業及び92項目の想定事業量を掲げ、進捗管理に活用しています。

【令和7年度主要事業等進捗状況】

進捗状況		主要事業（44事業）	
		想定事業量（92項目）※重複（6項目）含む	割合（％）
目標・想定を上回ったもの	◎	7項目	7.6
おおむね目標・想定どおりのもの	○	71項目 ※重複（2項目）含む	77.2
目標・想定を下回ったもの	△	11項目 ※重複（4項目）含む	12.0
現時点で評価できないもの	－	3項目	3.2

本日は、指標及び主要事業の想定事業量のうち、目標・想定を下回ったものとして△と表示している項目を含め、主な項目について次のページ以降で説明します。

2 本計画（令和6年度～9年度）の主要事業等の進捗状況

（水道事業）

施策目標1 安全で良質な水 指標

指標名	計画策定時点	令和7年度	目標値（令和9年度）
浄水場出口における 「水質管理値」の達成率	100% （令和5年度末見込み）	100%	100% （毎年度）

施策1 水源保全

主要事業1 道志水源林の保全								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①水源林の整備面積	305ha （令和2年度～令和5年度末見込み）	57ha	58ha			○		230ha （令和6年度～令和9年度）
		115ha/230ha						
②ドローンを活用した被害調査	－	被害状況調査	被害木892本			○		被害状況の把握
③ナラ枯れの抑制（くん蒸処理）	1,600本/年	1,360本/年	1,275本/年			○	発見したナラ枯れは、全量処理済み	1,500本/年

施策目標 1 安全で良質な水

施策 2 水安全計画に基づく水質管理

主要事業 2 水源水質の変化への対応								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値（令和 9 年度）
青山活性炭注入設備の運用	設置・運用 （令和 5 年度～）	かび臭物質濃度 （3 ng/L 以下）の遵守	かび臭物質濃度 （3 ng/L 以下）の遵守			○		かび臭物質濃度 （3 ng/L 以下）の遵守（通年）
		かび臭物質の除去効果 の確認、最適注入率 の検討	かび臭物質の除去効果 の確認、最適注入率 の検討				活性炭注入設備の最適な運用方法の 検討・実施	
主要事業 3 水質管理体制の維持・強化								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値（令和 9 年度）
①ISO 9001に基づく 浄水処理	ISO 9001の認証継続	ISO 9001の 認証継続	ISO 9001の 認証継続			○		ISO 9001の認証継続
②水道GLPに基づく 高精度の水質検査	水道GLPの認定継続	国等の精度 管理試験を 実施	国等の精度 管理試験を 実施 水道GLPの 認定継続			○		水道GLPの認定継続
③有機フッ素化合物の 測定回数 （3 浄水場の原水）	合計12回/年	合計32回/年	合計32回/年			○		合計32回以上/年 〔川井浄水場（道志川系統）：4 回/年〕 〔西谷浄水場（相模湖系統）：4 回/年〕 〔小雀浄水場（馬入川系統）：24回/年〕
④有機フッ素化合物の 測定可能項目数 （3 浄水場の原水）	3 項目	15項目	16項目			○	1 項目追加 （HFPO-DA）	15項目

施策目標 1 安全で良質な水

施策 2 水安全計画に基づく水質管理

主要事業 4 西谷浄水場の再整備								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値（令和 9 年度）
①浄水処理施設の整備	工事中	設計・施工	施工			△	浄水場敷地内のレンガ混じり土砂対応のため、工事完了時期を見直し - 耐震化・処理能力増強（令和10年度→令和12年度） - 粒状活性炭処理導入（令和14年度→令和16年度）	工事（継続）耐震化・処理能力増強：令和10年度完了予定 粒状活性炭処理導入：令和14年度完了予定
②排水処理施設の整備	工事中	施工	施工			○		工事完了（令和 9 年度）
③導水管の整備	工事中	施工	施工			△	地盤性質への対応等のため、工事完了時期を見直し （令和 9 年度→令和12年度）	工事完了（令和 9 年度）

施策目標 1 安全で良質な水

施策 3 直結給水の促進

主要事業 5 直結給水の促進								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値 (令和 9 年度)
直結給水の促進に向けた取組	直結給水への切替の広報・相談の実施	直結給水への切替の広報・相談の実施	直結給水への切替の広報・相談の実施			○		直結給水への切替の広報・相談の実施
主要事業 6 子どもたちが水道水を飲む文化を育む事業								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値 (令和 9 年度)
直結化工事に対する助成 (教育委員会事務局からの依頼に対する助成率)	100% (令和 2 年度～令和 5 年度末見込み)	100%	100%			○		100% (令和 6 年度～令和 9 年度)

施策目標 2 災害に強い水道

指標

指標名	計画策定時点	令和 7 年度	目標値（令和 9 年度）
導水施設の耐震化率	69% （令和 5 年度末見込み）	69%	72% （令和 9 年度）
送配水管の耐震管率 （全口径）	33% （令和 5 年度末見込み）	35%	37% （令和 9 年度）

施策目標 2 災害に強い水道

施策 4 水道施設の更新・耐震化

主要事業 7 基幹施設の更新・耐震化

想定事業量		計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値(令和9年度)
①相模・横浜ずい道耐震補強		耐震診断の実施	耐震診断完了	基本設計履行中			○		耐震化の方針決定(令和9年度)
②西谷浄水場の再整備(再掲)	浄水処理施設の整備	工事中	設計・施工	施工			△	浄水場敷地内のレンガ混じり土砂対応のため、工事完了時期を見直し ・耐震化・処理能力増強(令和10年度→令和12年度) ・粒状活性炭処理導入(令和14年度→令和16年度)	工事(継続) 耐震化・処理能力増強：令和10年度完了予定 粒状活性炭処理導入：令和14年度完了予定
	排水処理施設の整備	工事中	施工	施工			○		工事完了(令和9年度)
	導水管の整備	工事中	施工	施工			△	地盤性質への対応等のため、工事完了時期を見直し(令和9年度→令和12年度)	工事完了(令和9年度)
③峰配水池耐震補強		整備方針決定	検討	基本設計の設計依頼中			○		設計完了(令和9年度)
④(仮称)高塚から上飯田線ループ管新設工事		施工中	施工	施工			△	施工方法を見直し(交通事業者との調整)したため、工事工程が変更となり、工事完了時期を見直し(令和7年度→令和8年度)	工事完了(令和7年度)
⑤ポンプ場等監視制御設備の更新		8か所 (令和2年度～令和5年度末見込み)	2か所	2か所			△	半導体供給状況に鑑み更新時期を見直し ・磯子・綱島台(令和7年度→令和8年度) ・菅田・平楽・川井配水(令和8年度→令和9年度)	10か所 (令和6年度～令和9年度)
4か所/10か所									

施策目標 2 災害に強い水道

施策 4 水道施設の更新・耐震化

主要事業 8 送配水管の更新・耐震化								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値 (令和 9 年度)
① 鋳鉄管 (CIP) の更新・耐震化	72km (令和 2 年度～令和 5 年度末見込み)	8 km	11km			○		40km程度※ (令和 6 年度～令和 9 年度)
		19km/40km						
② 送配水本管 (主に口径400mm以上)の更新・耐震化	10km (令和 2 年度～令和 5 年度末見込み)	2. 4km	4. 2km			△	入札不調により一部工事の発注を延期 (令和 7 年度→令和 8 年度)	20km程度※ (令和 6 年度～令和 9 年度)
		6. 6km/20km						
③ 重要拠点施設につながる管路の耐震化実施数	40施設 (令和 2 年度～令和 5 年度末見込み)	7 施設	17施設			○		40施設 (令和 6 年度～令和 9 年度)
		24施設/40施設						
主要事業 9 給水管の更新・耐震化								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値 (令和 9 年度)
給水管の更新・耐震化件数	約1,600件/年 (令和 2 年度～令和 5 年度平均)	1,439件/年	1,212件/年			△	・配水管布設替工事に伴う給水管取付替：649件 (目標：1,000件/年) ・老朽給水管改良促進事業：563件 (目標：500件/年)	1,500件/年

※一部、令和10年度以降に継続する工事が含まれます。

施策目標 2 災害に強い水道

施策 5 災害対応力の強化

主要事業10 他都市等との連携強化								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①日本水道協会合同 防災訓練等	13回 （令和2年度～ 令和5年度末 見込み）	4回	4回			○		15回 （令和6年度～令和 9年度）
		8回/15回						
②名古屋市との 合同防災訓練等	10回 （令和2年度～ 令和5年度末 見込み）	2回	3回			○		12回 （令和6年度～令和 9年度）
		5回/12回						
主要事業11 災害時の通信体制強化								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
5GHz帯無線通信 システム導入庁舎数	8庁舎 （令和5年度末）	13庁舎	令和6年度 事業完了済			○	水道事務所の統廃合（予定） により、目標値を13庁舎に 変更	16庁舎 （令和9年度末）
		13庁舎/16庁舎						

施策目標2 災害に強い水道

施策6 災害時の迅速な応急給水・応急復旧に向けた取組

主要事業12 耐震給水栓の整備								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値(令和9年度)
耐震給水栓整備箇所数	36か所 (令和2年度～令和5年度末見込み) (累計48か所)	5か所	10か所			◎		27か所 (令和6年度～令和9年度) (累計75か所)
		15か所(累計63か所)/27か所(累計75か所)						
主要事業13 民間企業等との連携								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値(令和9年度)
①管工事協同組合への 応急給水施設及び 応急給水装置等の保守 点検委託	市内全ての応急給水 施設552か所で 点検実施 (令和5年度末 見込み)	551か所	550か所			○	令和7年度末時点の対象施設 550か所	市内全ての応急給水 施設552か所で 点検実施 (毎年度)
②防災訓練への 管工事協同組合の 参加か所数	160か所 (令和5年度末 見込み)	155か所/年	156か所/年			○		160か所/年
③災害拠点病院・救急告 示医療機関での 応急給水訓練の実施	全ての病院で 訓練実施※ (令和2年度～ 令和5年度末 見込み)	14回	11回			○	令和7年度時点の対象施設 60か所	全ての病院で訓練実 施※ (令和6年度～令和 9年度)
		25回/60か所全ての病院※						
④民間企業と連携した 防災訓練等の実施	16回 (令和5年度末 見込み)	18回/年	17回/年			○		16回/年

※災害拠点病院・救急告示医療機関数は年度によって変動します。

施策目標3 環境にやさしい水道

指標

指標名	計画策定時点	令和7年度	目標値（令和9年度）
V V V F制御方式に更新するポンプ場における電力原単位※	0.187kWh/m ³ （令和4年度末）	0.177kWh/m ³	0.170kWh/m ³ （令和9年度）

※電力原単位：水道水1立方メートルを配水するのに必要な電力量のこと

施策7 自然流下系施設の整備

主要事業14 西谷浄水場の再整備（再掲）								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①浄水処理施設の整備	工事中	設計・施工	施工			△	浄水場敷地内のレンガ混じり土砂対応のため、工事完了期間見直し ・耐震化・処理能力増強（令和10年度→令和12年度） ・粒状活性炭処理導入（令和14年度→令和16年度）	工事（継続） 耐震化・処理能力増強：令和10年度完了予定 粒状活性炭処理導入：令和14年度完了予定
②排水処理施設の整備	工事中	施工	施工			○		工事完了（令和9年度）
③導水管の整備	工事中	施工	施工			△	地盤性質への対応等のため、工事完了時期を見直し（令和9年度→令和12年度）	工事完了（令和9年度）

施策目標3 環境にやさしい水道

施策8 省エネルギー化に向けた取組

主要事業15 エネルギーの効率化を目指した施設整備（VVF制御方式への変更）								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
VVF制御方式 ポンプへの更新	3か所 （令和2年度～ 令和5年度） （累計17か所）	1か所	0か所			○		2か所 （令和6年度～令和9年度） （累計19か所）
		1か所（累計18か所） / 2か所（累計19か所）						
主要事業16 高効率モータ使用機器への更新による省エネルギー化								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
送排風機の高効率 モータ使用機器 への更新台数	3台 （令和2年度～ 令和5年度） （累計6台）	10台	7台			○		38台 （令和6年度～令和9年度） （累計44台）
		17台（累計23台） / 38台（累計44台）						
主要事業17 LED等高効率照明の導入								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
LED等高効率照明の 導入率	22% （令和4年度末）	34%	52% （令和7年 度末見込 み）※			—		90% （令和9年度末）
主要事業18 次世代自動車等の導入								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
次世代自動車等の 導入率	8% （令和4年度末）	29%	35% （令和7年 度末見込 み）※			—		67% （令和9年度末）

※令和7年度の実績値については、今後エネルギーカルテシステムで集計され、10月頃公表予定

施策目標3 環境にやさしい水道

施策9 再生可能エネルギーの活用

主要事業19 太陽光発電設備等の導入促進								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
太陽光発電設備の導入	4 か所 （令和5年度末） （累計4 か所）	導入可能性調査の実施	プロポーザル公募・事業者決定			○	導入可能性調査結果により目標値の内訳を変更 新設（2 か所→3 か所） 増設（2 か所→1 か所）	新設2 か所 増設2 か所 （令和6年度～令和9年度） （累計6 か所）
		新設・増設 0 か所/4 か所						

施策10 水源林保全の取組

主要事業20 市民ボランティアによる民有林整備の支援								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
ボランティア 参加人数	1,656人 （令和2年度～ 令和5年度末 見込み）	752人	687人			○		2,600人 （令和6年度～令和 9年度）
		1,439人/2,600人						

施策目標4 充実した情報とサービス

指標

指標名	計画策定時点	令和7年度	目標値（令和9年度）
お客さま満足度 （水道事業全般）	88.4% （令和4年度）	93.4%	90% （令和8年度）

施策11 「伝わる」広報の展開

主要事業21 市民ニーズ等を踏まえた情報発信								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①広報印刷物の発行	発行	発行	発行			○		発行
②ウェブサイト・SNSでの情報発信	310回 （令和5年度未見込み）	583回/年	571回/年			◎		340回/年

施策目標 4 充実した情報とサービス

施策11 「伝わる」広報の展開

主要事業22 水道施設や工事現場の見学等の充実								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①水道水質の安全性に関する情報提供	ウェブサイト等での情報提供	ウェブサイト等の内容の充実	ウェブサイト等の内容の充実			○		ウェブサイト等の内容の充実
		イベント等での安全性のPR	イベント等での安全性のPR					イベント等での安全性のPR
②浄水場等の見学	現場見学・説明	見学プログラムの改善	見学プログラムの実施			○		見学者のニーズを踏まえた見学プログラムの拡充
③水道施設の更新工事における現場見学会	10回 （令和2年度～令和5年度）	9回	14回			◎		34回 （令和6年度～令和9年度）
		23回/34回						
④水源地の魅力を知ってもらうための取組	実施内容検討	コース概要の作成	1回/年			○		実施に向けた調整 （令和6年度） 水源地視察ツアー 1回/年 （令和7年度～令和9年度）
主要事業23 給水スポット設置による水道水のPR								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
給水スポットの設置	－	2か所	1か所			○	横浜グリーンエキスポ 会場内に8か所設置 （予定）	4か所 （令和6年度～令和9年度）
		3か所/4か所						

施策目標 4 充実した情報とサービス

施策12 時代のニーズを捉えたサービスの推進

主要事業24 水道に関する情報照会や手続きのオンライン化の拡充								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①ウェブページの申請画面の改善	－	実施	令和6年度事業完了済			○		実施 （令和6年度完了）
②オンライン申請の拡充	口座振替申込 （令和5年度導入予定）	漏水に伴う使用水量認定申請のオンライン化	令和6年度事業完了済			○		漏水に伴う使用水量認定申請 （令和6年度完了）
		水道料金減免申請関係（一部）のオンライン化	令和6年度事業完了済					水道料金減免申請関係（一部） （令和7年度完了）
③AIチャットボットによる問い合わせ	一部の問い合わせのみ	実施	運用			○	料金関連の問い合わせを開始	対応可能な内容を拡充
④検針票・請求書のペーパーレス化	－	調査・検討	調査・検討			○		一部試行

施策目標 4 充実した情報とサービス

施策12 時代のニーズを捉えたサービスの推進

主要事業25 スマートメーターの導入に向けた取組								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①第1次モデル事業	運用開始・効果検証	運用検証	自動検針の 効果検証			○		自動検針の効果検証
②第2次モデル事業	方針策定	準備 (プレフィ ールドテス ト等)	運用開始			○		準備（令和6年度） 運用開始（令和7年度～） 効果検証（令和8年度～）
③東京都・大阪市 との3都市連携	仕様の共通化と 利活用の検討	情報共有・ 意見交換	仕様の共通 化と利活用 の検討			○		仕様の共通化と利活用の検討

施策目標5 国内外における社会貢献

指標

指標名	計画策定時点	令和7年度	目標値（令和9年度）
国際技術協力や海外水ビジネスをテーマにしたセミナー等の開催数	36回 （令和2年度～令和5年度末見込み）	22回 （令和6年度～令和7年度）	40回 （令和6年度～令和9年度）
水道局発注工事における平準化率 （4月～6月の月平均稼働工事件数/ 年度の月平均稼働工事件数）	0.80 （令和4年度）	0.84 （速報値）	0.85 （令和9年度末）

施策13 国内外水道事業への支援

主要事業26 国内外水道事業への貢献と市内企業の海外水ビジネス展開支援								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①国内研修受講者数	900人 （令和2年度～令和5年度末見込み）	373人	333人			◎		1,000人 （令和6年度～令和9年度）
		706/1,000人						
②海外研修員の受入人数	150人 （令和2年度～令和5年度末見込み）	123人	138人			◎	JICA課題別研修「アフリカ地域都市上下水道管理技術者養成」 JICA技術協力プロジェクト「ラオス国水道事業運営能力向上プロジェクト」等	180人 （令和6年度～令和9年度）
		261人/180人						
③職員の海外派遣人数	30人 （令和2年度～令和5年度末見込み）	39人	48人			◎	JICA草の根技術協力事業「インドネシア国北スマトラ州水道公社安全な24時間給水のための能力向上プロジェクト」等	52人 （令和6年度～令和9年度）
		87人/52人						

施策目標 5 国内外における社会貢献

施策14 市内経済の発展と地域課題の解決への貢献

主要事業27 市内中小企業者の受注機会確保								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
市内中小企業者の受注件数割合	88.7% (2,288件/2,580件) (令和4年度末)	85.4%	84.0%			○		90%以上/年
主要事業28 建設現場等の働き方改革と人材育成の支援								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①発注工事の施工時期の平準化	発注・施工時期を平準化した計画に基づく工事発注	計画に基づく工事発注	計画に基づく工事発注			○		発注・施工時期を平準化した計画に基づく工事発注
②4団体※への研修の実施	1回/年	1回/年	1回/年			○		1回/年

※「（一社）横浜市建設コンサルタント協会」、「（一社）横浜市地質調査協会」、「（一社）県測量設計業協会横浜支部」、「横浜市補償コンサルタント協会」

施策目標 5 国内外における社会貢献

施策14 市内経済の発展と地域課題の解決への貢献

主要事業29 工事事故の防止								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①工事安全大会の実施	工事所管部署 各1回以上/年	工事所管 部署 各1.7回/年	工事所管 部署 各1.9回/年			○		工事所管部署 各1回以上/年
②工事安全研修の実施	1回/年	1回/年	2回/年			○		1回/年
③指定給水装置工事 事業者研修会の開催	1回/3年	—	—			—		1回/3年 (令和8年度実施)
主要事業30 障害者就労施設等からの優先調達								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
障害者就労施設等 からの調達実績額	1,560万円 (令和5年度末 見込み)	1,469万円	1,596万円			○		前年度を上回る 調達実績額（毎年度）

指標

指標名	計画策定時点	令和 7 年度	目標値（令和 9 年度）
送配水管の精緻な更新計画策定	-	-	策定 （令和 9 年度）
男性職員の育児休業取得率 （1 か月以上を推奨）	66.7% （令和 4 年度）	81.8%	100% （令和 9 年度）

施策15 施設の維持管理の強化とアセットマネジメントの推進

主要事業31 送配水管の精緻な更新計画策定に向けたデータベースの活用								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値（令和 9 年度）
マッピングシステム （データベース）の 改良・活用	各種データベース 構築・運用	評価方法及 び判断基準 の検討、 発注準備	完了			○		管路更新の優先度評価の 精度向上

施策目標 6 持続可能な経営基盤

施策15 施設の維持管理の強化とアセットマネジメントの推進

主要事業32 露出管路や管路附属設備の維持管理の強化とアセットマネジメントの推進								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①露出管路の修繕・更新	状態監視による修繕・更新	アセットマネジメント調査委託	アセットマネジメント調査委託完了			○	令和7年度 水管橋長寿命化：14橋	新たなアセットマネジメント手法による修繕・更新の計画策定・実施
		水管橋長寿命化	水管橋長寿命化					
		マッピング改良	マッピング改良完了					
②管路附属設備の修繕・更新	状態監視による修繕・更新	鉄蓋補修・交換	鉄蓋補修・交換			○	令和7年度鉄蓋補修・交換：244基	新たなアセットマネジメント手法による修繕・更新の計画策定・実施
		仕切弁調査 ボルト交換	仕切弁補修・交換				令和7年度仕切弁補修・交換：1,516基	
③新たな手法等の開発・導入	—	試験施工の実施	令和6年度事業完了済			○	実証実験により、課題が判明したため、共同研究を中止	マンホール鉄蓋の新たな補修工法：開発完了（令和6年度）
		実証実験の実施	令和6年度開発中止					赤外線サーモグラフィによる二重管路の漏水探知方法：開発完了（令和8年度）
		開発完了	令和6年度事業完了済					鋼製水管橋の漏水補修材：開発完了（令和6年度）

施策目標 6 持続可能な経営基盤

施策15 施設の維持管理の強化とアセットマネジメントの推進

主要事業33 設備や配水池等の維持管理の強化とアセットマネジメントの推進								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①電気機械設備の劣化診断	機器耐用年数経過後、状態により修繕及び更新を実施	劣化診断手法の検討	メーカーヒアリングの実施、マッチングサービスの利用検討			○		AIによる既存データの解析及び、劣化診断結果を踏まえた修繕・更新時期見直しの検討
②配水池の保全・更新計画策定	策定に向けた健全度調査中	計画策定に向けた準備	保全・更新計画策定			○		保全・更新計画策定
③建築物の台帳作成・点検体制整備	台帳作成：0/319棟	台帳作成：61棟	台帳作成：102棟			○		台帳作成：319/319棟
	点検方法の検討	点検方法の検討	点検方法の検討					点検方法の立案

施策16 将来の横浜の水道システム構築に向けた取組

主要事業34 小雀浄水場の廃止に向けた計画の策定								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
小雀浄水場の廃止に向けた計画策定	—	検討	検討			○		検討・策定

主要事業35 水道事業におけるICT活用・DX推進								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①水道ICT情報連絡会を通じたICTの導入検討	課題発信、提案技術の確認	課題発信、技術提案の募集	課題発信、技術提案の募集			○		課題発信、提案技術の確認
	ICTの導入検討	ICTの導入検討	ICTの導入検討					ICTの導入検討
②ICTを活用したポンプ施設の遠隔監視導入	-	実証試験を実施（仏向ポンプ場）	ドローン導入に向け詳細検討の実施 センサ導入に向け施工中			○		試行導入・検討
③クラウド型IoTによる遠隔漏水監視導入	-	対象路線の選定・試行導入	試行導入			○		試行導入・検討
④水道施設の整備・維持管理における3Dモデルの活用	西谷浄水場の再整備における導入・活用	3Dモデルの活用	3Dモデルの活用			○		西谷浄水場の再整備での3Dモデル作成、活用（継続）
		再整備後の維持管理での活用検討	活用できる維持管理業務の抽出					再整備後の維持管理での活用検討

施策目標 6 持続可能な経営基盤

施策18 組織力向上に向けた人材育成・技術継承・職場環境づくり

主要事業36 コンプライアンスの推進								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①リスクマネジメント及び内部統制制度の運用	リスクの抽出／評価、行動計画の策定、行動計画のモニタリング、最終的な自己評価（毎年度）	リスクの抽出／評価、行動計画のモニタリング、最終的な自己評価等の実施（毎年度）	リスクの抽出／評価、行動計画のモニタリング、最終的な自己評価等の実施（毎年度）			○		リスクの抽出／評価、行動計画の策定、行動計画のモニタリング、最終的な自己評価（毎年度）
②不祥事防止研修の実施	各所属 1回/年	各所属 1回/年	各所属 1回/年			○		各所属1回/年
主要事業37 人材確保・育成と技術継承								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①水道技術職の受験勧奨（訪問・電話・資料送付等によるアプローチ）	86校/年 （令和2年度～令和5年度平均）	110校/年	115校/年			○		100校以上/年
②人材育成方針の策定等	方針策定済	現状の検証、人材育成方針の決定	試行運用の実施検証会の開催 本格運用に向けた整理			○		方針に基づく人材育成の実施・振り返り、方針の改定（令和6年度～令和9年度）

施策目標 6 持続可能な経営基盤

施策18 組織力向上に向けた人材育成・技術継承・職場環境づくり

主要事業38 職員のワーク・ライフ・バランス、女性活躍、いきいきと働き続けられる職場づくりの推進								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①1月あたりの超過勤務時間が80時間超の人数	0人 （令和5年度末見込み）	2人	0人			○		0人 （毎年度）
②テレワーク環境の整備	専用端末40台による実施	42台	42台			○		・専用端末による実施を継続 ・新たな環境整備や制度運用について検討・実施

施策目標6 持続可能な経営基盤

施策19 効率的な事業実施に向けた体制づくり

主要事業39 施設の更新・耐震化における効率的・効果的な事業手法の検討								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
①配水ポンプの更新・維持管理における官民連携手法の導入検討	—	導入可能性調査の実施	検討完了			○		検討 （令和6年度～令和9年度）
②小口径管路の更新・耐震化事業における設計業務の委託化	実施	・効果検証 ・委託拡大の方向性決定	委託拡大			○		・効果検証、委託拡大の方向性決定 （令和6年度） ・委託拡大 （令和7年度～）
③小口径管路の更新・耐震化事業における監督業務の委託化	導入検討	調査・検討	調査・検討			○		・調査・検討 （令和6年度～令和8年度） ・委託の方向性決定 （令和9年度）
④大口径管路の更新・耐震化事業におけるDB方式等の導入	試行工事契約一部検証	試行工事実施・検証	・試行工事実施・検証 ・その他官民連携手法の検討に向けた情報収集			○		・試行工事実施・検証 （令和6年度～令和7年度） ・検証結果を踏まえた導入検討 （令和8年度～） ・その他官民連携手法の検討 （令和6年度～令和9年度）

施策目標 6 持続可能な経営基盤

施策19 効率的な事業実施に向けた体制づくり

主要事業40 効率的な執行体制の構築								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値(令和9年度)
効率的・効果的な執行体制の構築	検討	検討、一部実施	検討			○		実施

施策20 経費削減・財源確保の取組

主要事業41 事業見直しによるコスト削減								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
コスト削減の取組	61億円 （令和5年末見込み）	14.3億円	18.6億円			◎		40億円 （令和6年度～令和9年度）
		32.9億円/40億円						
主要事業42 保有資産の有効活用等による財源確保								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
保有資産の貸付、売却等による財源確保	21億円 （令和2年度～令和5年度末見込み）	3.7億円	4.3億円			○		16億円 （令和6年度～令和9年度）
		8億円/16億円						

施策目標 2 災害に強い水道 指標

指標名	計画策定時点	令和7年度	目標値（令和9年度）
東寺尾送水幹線の更新率	7% （令和5年度末見込み）	26%	50% （令和9年度末）

施策1 工業用水道施設の更新・耐震化

主要事業1 東寺尾送水幹線の更新・耐震化								
想定事業量	計画策定時点	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	進捗状況	備考	目標値（令和9年度）
東寺尾送水幹線の更新延長	1工区施工中 （令和2年度～令和5年度末見込み） （累計 0.8km）	1工区： 2.2km	2工区： シールドマシン完成			○		1工区・2工区施工完了 4.9km （令和6年度～令和9年度） （累計 5.7km）
		2.2km（累計 3.0km）/4.9km（累計 5.7km）						

施策目標 6 持続可能な経営基盤 指標

指標名	計画策定時点	令和 7 年度	目標値（令和 9 年度）
相模湖系統への統合に向けた施設整備	-	-	工事着手 （令和 9 年度）

施策 2 工業用水道施設の再構築

主要事業 2 相模湖系統への統合に向けた施設整備								
想定事業量	計画策定時点	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	進捗状況	備考	目標値（令和 9 年度）
統合に向けた施設整備計画の策定	-	検討	検討			△	将来水需要予測の精度向上に向けた追加調査・検討のため、策定期間を見直し（令和 7 年度→令和 8 年度）	策定 （令和 7 年度）
