



# まちづくりニュース

## (花月園競輪場跡地)



令和2年3月1日

発行：横浜市 環境創造局、都市整備局  
UR都市機構 東日本都市再生本部

### 現在の進捗状況と地区公園について

現在、地区公園の多目的広場北側を中心に工事を行っております。今後は地区公園の南西側及び西側道路の工事にも本格的に着手していきます。

「宅地2」内における建物(旧社宅)解体工事の施工不良に伴う埋戻し・地盤改良工事は完了し、造成工事を再開する準備を進めています。全体スケジュールについては、造成・道路等の工事が令和元年度末に終了する予定でしたが、造園工事と並行して施工し、令和2年度末まで工事期間を延長することになりました。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、今後ともご理解・ご協力のほどお願いします。


また、地区公園の命名及び公園愛護会等の結成については、各町内会長の皆様と意見交換しながら進めています。

なお、工事期間中の周辺地域への環境改善対策として緑化プランター等の設置を行っていきます。

### 令和2年度予定の工事について

日頃から本工事に対するご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。  
令和2年度は、事業完了に向けて下記工事を進めていきます。


- ① 事業区域内の整備工事（造成・道路工事等）
- ② 周辺道路の整備工事（北側道路・西側道路・東側道路・八幡前二見台線）
- ③ （仮称）鶴見花月園公園整備工事・多目的広場整備工事

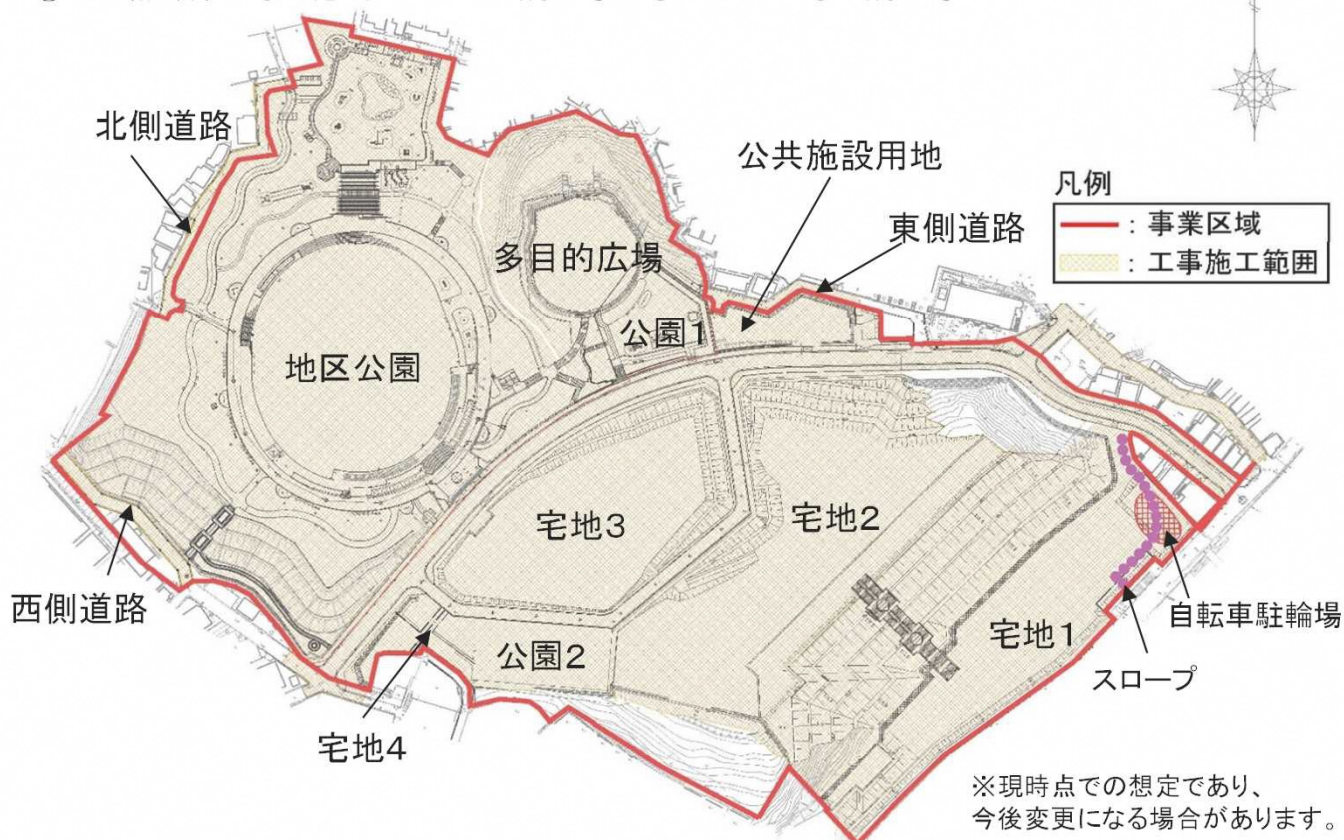

※現時点での想定であり、今後変更になる場合があります。

## 地区公園南西側斜面及び西側道路の工事について

地区公園と隣接する西側道路部の工事の準備を行っていましたが、令和2年4月頃から地区公園南西側斜面地の法面保護工事等に着手していきます。

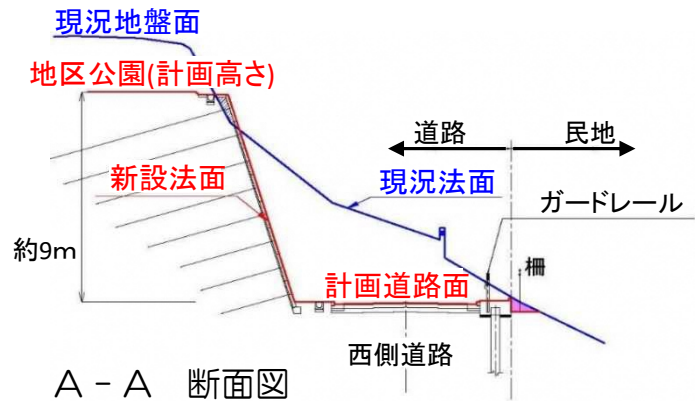

## 現場視察会の報告について

令和元年12月20日に、意見交換会のメンバーの各町内会長の皆様に、現場視察をしていただきました。工事期間中の限られた条件の中で、当日は、センター保育園前から、UR監督員事務所のある宅地3まで歩いていただき、工事の進捗状況を確認していただきました。



## 工事中の環境改善対策について

工事中の環境改善対策として、春頃より緑化プランター等の設置を行います。

多くの皆様にお花を楽しんでいただけるよう、設置場所等について検討していますので、詳細が決まり次第お知らせいたします。



## 事業全体スケジュール(予定)

2015 H27年度	2016 H28年度	2017 H29年度	2018 H30年度	2019 R元年度	2020 R2年度	
開発手続	解体工事	造成・擁壁・上下水道施設・道路等工事			公園整備工事	延長した部分
				現在	スロープ工事	

鶴見一丁目地区の状況はこちらでもご覧になれます  
⇒<http://www.ur-net.go.jp/tsurumi>

( (仮称)鶴見花月園公園の整備内容等について)

■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話 045-671-4612

(地区全体のまちづくりの考え方について)

■横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課

電話 045-671-2667

(地区全体の整備内容や事業スケジュール等について)

■UR都市機構 東日本都市再生本部

(計画関連) 事業推進部 事業推進第2課

電話 03-5323-0589

(工事関連) 基盤整備計画部 基盤統括課

電話 03-5323-0848

(工事について)

■UR都市機構 UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所

電話 0120-454-081

電話 080-1036-0238
