

周辺住民の皆様へ

(仮称) 舞岡墓園整備事業について (お知らせ)

日頃から横浜市政に御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

戸塚区舞岡町及び吉田町で進めている標記事業について、整備工事等の進捗状況及び事業スケジュールの見直しについてお知らせします。

1 整備工事等の進捗状況について

工事名	期間	場所	受託者・請負人
埋蔵文化財発掘調査その3	平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで	下図A	公益財団法人 横浜市ふるさと歴史財団
造成工事その2	平成31年4月25日から 令和2年3月31日まで	下図B	株式会社新世
造成工事その3	令和元年10月21日から 令和2年12月28日まで	下図C	株式会社松尾工務店

2 事業スケジュールの見直しについて


令和3年度の工事完了及び供用開始を目指し工事を進めていましたが、工事に使用可能な平坦地が限られることが判明し、複数の工事の並行施工が難しいこと等から、

- ・造成工事の完了が令和4年度まで
- ・造園、建築等の施設整備工事が造成工事完了後、概ね4年程度(令和8年度頃まで)

かかる見込みで、その後供用を開始します。

既に自宅にご遺骨をお持ちの方で納骨をお急ぎの方は、生前・改葬枠とは別に遺骨保持枠で応募可能な日野こもれび納骨堂や、一時的にご遺骨を預けられる久保山霊堂のご利用もご検討ください。

皆様の御理解、御協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

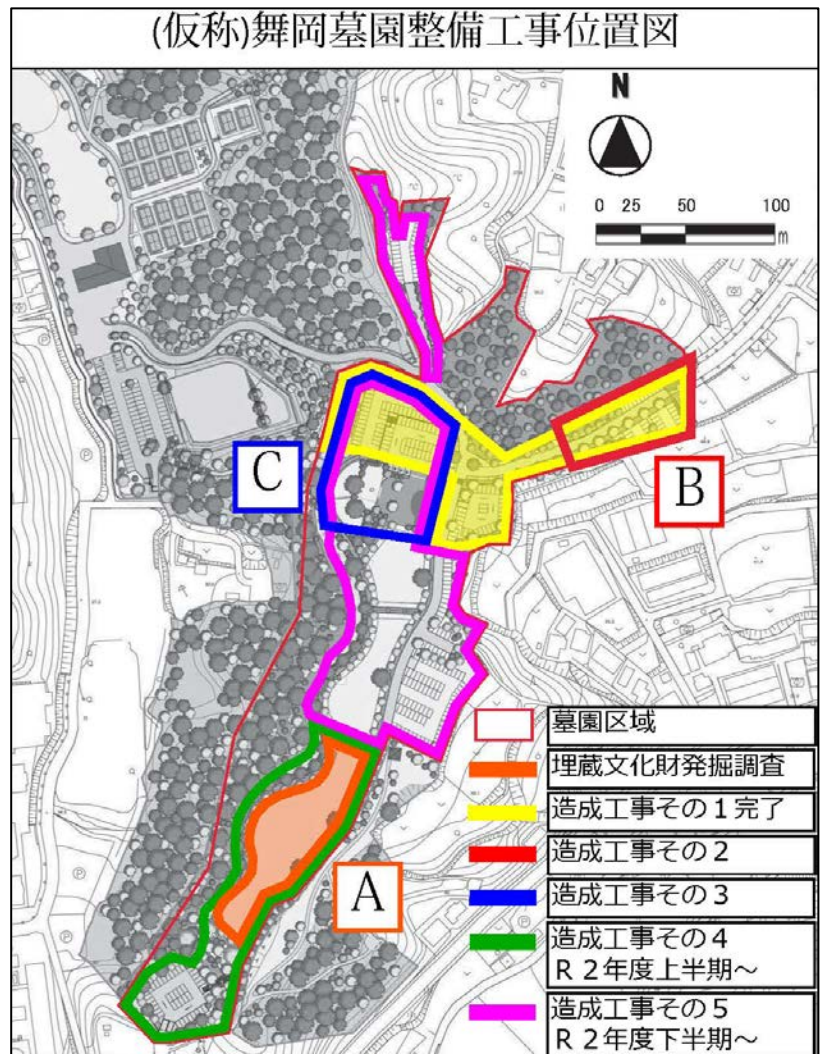

担当：墓園事業について 横浜市健康福祉局環境施設課 電話 045-671-4387
墓園工事について 横浜市建築局施設整備課 電話 045-671-2960
