
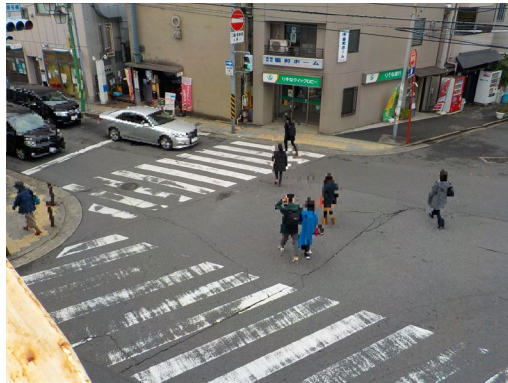


令和4年度 道路改進黨業完成箇所の整備効果

事業名称	主要地方道東京丸子横浜港北区菊名四丁目地内交差点改良工事		
事業期間	令和元年度～令和4年度	事業箇所	港北区菊名六丁目3番地先から菊名四丁目2番地先まで
事業費	197,277千円		
事業内容	交差点整備(歩道設置) 延長 L=35.0m 車道幅員=5～11m(現況車道幅員5～8m) 歩道幅員=2～9m(現況歩道幅員0～2m)		
事業効果	<p>(実施前) 本事業箇所の菊名四丁目交差点は通学路であり、東急菊名駅が付近にあること、市営バスや東急バス、神奈川中央交通の3社が運航するバス路線である主要地方道東京丸子横浜線と市道菊名六角橋線7072号線が交差する、交通量の多い交差点です。本交差点の一部は、横断歩道の待機場所がなく、歩行者が安全に信号待ちをすることが出来ない状況でした。 また、交差点内の線形や見通しが悪いため、自動車にとっても円滑に通行出来る交差点ではありませんでした。</p>		
	<p>(実施後) 用地買収により横断歩道利用者の待機場所を新設するとともに道路線形を改善しました。 また歩道の整備にあたり、車止めやガードパイプ等の安全施設を設置しました。</p> <p>[効果] 信号待ちをする歩行者が、車止め等の安全施設に囲まれた滞留場所で待機できるようになり、駅への動線に考慮された形の横断歩道を設置しました。 また、車道線形を改善することにより交差点内を進入する車の見通しが良くなり緩やかに通行することができるようになりました。</p> <p>[地元町内会等の意見等] 交差点内の安全性が向上し、利用者が安心して通行できるように整備していただき感謝しています。</p> <p>令和4年6月1日供用開始</p>		



実施前

実施後
