

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年9月

青葉区下谷本町の施工状況



緑区北八朔町の施工状況



横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年9月

都筑区東方町の施工状況




④ 東方換気所工事の様子 (H28.9撮影)
(換気所の地下構造部の建設)



都筑区川向町の施工状況



⑤ 到達立坑の様子 (H28.9撮影)
(立坑建設のための掘削)

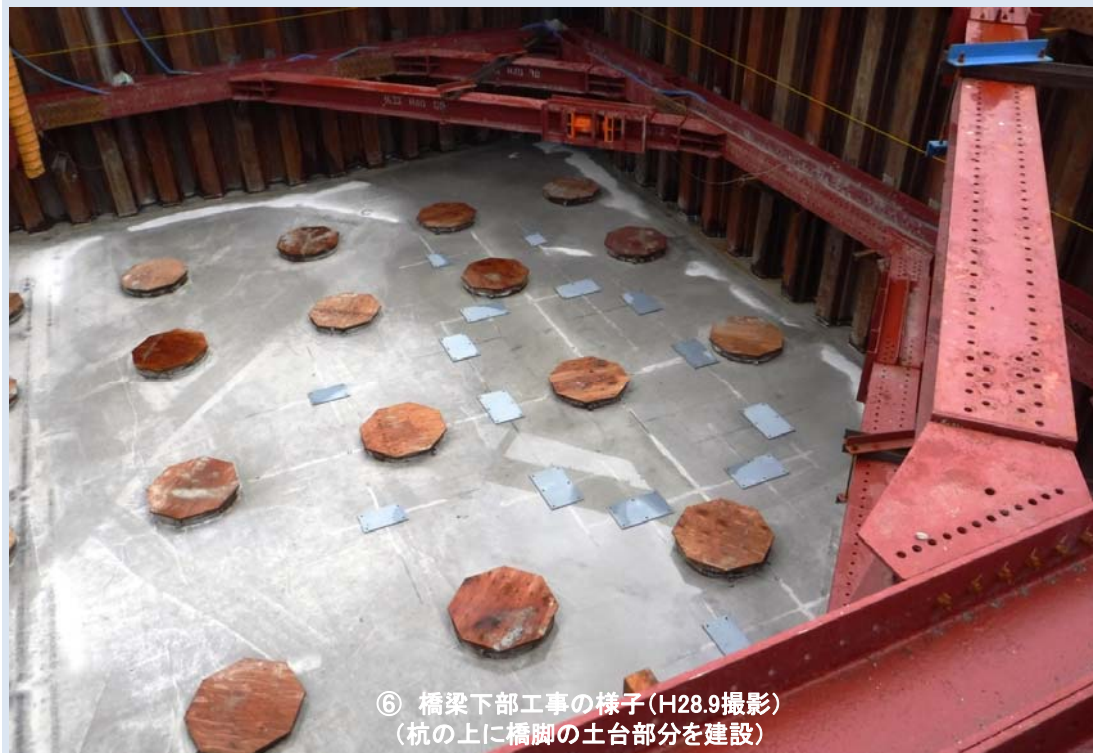

⑥ 橋梁下部工事の様子 (H28.9撮影)
(杭の上に橋脚の土台部分を建設)
