


# 中部水再生センター高速ろ過築造工事(その2)

- 工事場所：横浜市中区本牧十二天1番1号
- 工期：令和6年12月11日～令和8年1月30日
- 発注者：横浜市 下水道河川局 下水道施設部 下水道施設整備課
- 監督機関：横浜市 下水道河川局 下水道管路部 下水道事務所（南部）
- 工事目的：中部水再生センターの高速ろ過施設とポンプを接続する連絡管廊及び送水渠を新設するための工事
- 工事内容：管廊築造工 H=4,100 W=4,000 L=24.7  
ダクトイル鋳鉄管布設工(汚水管)( $\phi 1200\text{mm}$ ) L=137m  
雨水管撤去 VU $\phi 450$  新設VU $\phi 300$  L=68m  
人孔築造工 2基 1号人孔 他



## 進捗状況

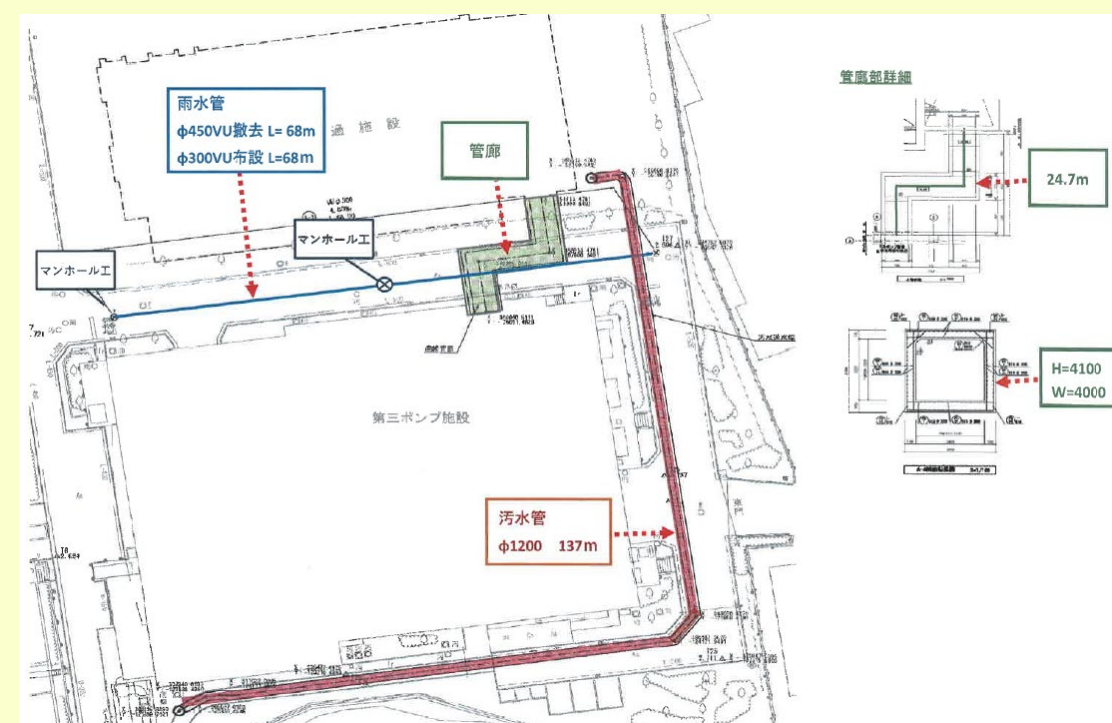

試掘工



鋼矢板工



地盤改良工
