



■小机駅周辺:経路23

道路特定事業計画書【生活関連経路】						
経路名		小机第259号線				
事業区間		横浜上麻生線交点～新横浜母と子の病院先				
事業番号		【S-2-3】				
事業延長		45m				
事業実施予定期間		2028年度				
【整備方針】						
課題：側溝と舗装に段差が出来ている。						
対策：側溝の改修による段差解消。						
【事業内容】						
整備項目				事業量	箇所番号	備考
歩行空間の確保						
歩道の拡幅		m				
道路構造の改修						
車道の改修		m ²				
歩道の改修	全面改修	m				
	部分改修	m ²				
	平坦性の改善	箇所				
	歩車道境界ブロックの改修	箇所				
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修						
経路誘導の連続敷設	新設	m				
	改修	m				
交差点等の部分敷設	新設	箇所				
	改修	箇所				
その他						
排水施設の改修		m	45	1		
【事業実施に際して配慮すべき重要事項】						

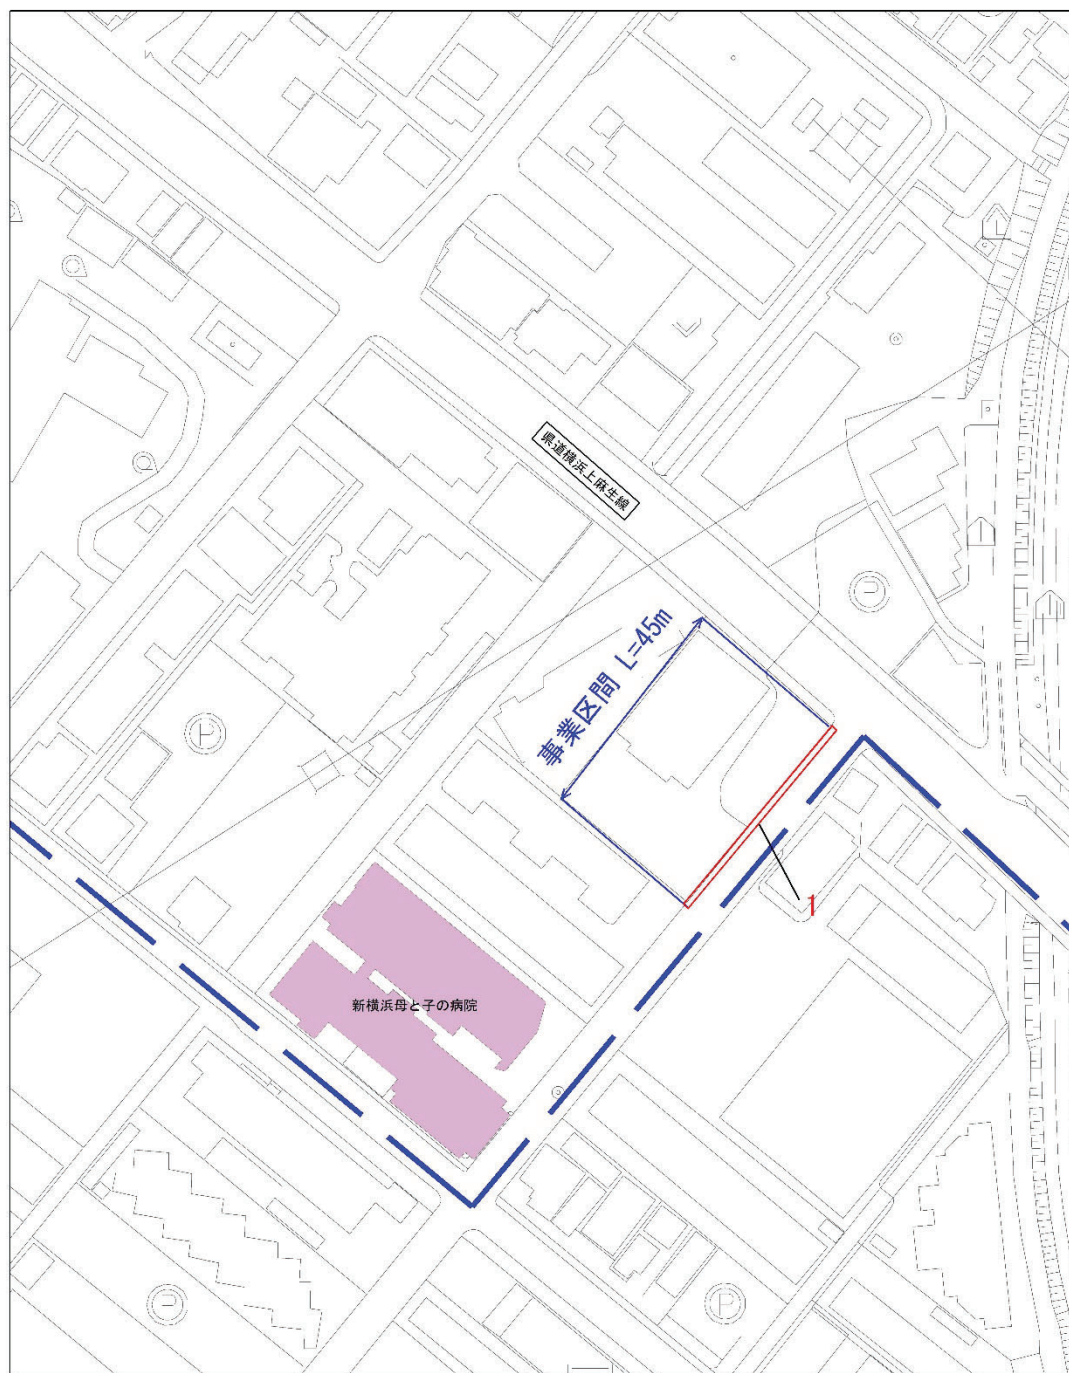

【凡例】



重点整備地区の区域
 1 整備箇所



【横浜市建築局都市計画基本図データ（地図情報レベル2500）により作成】

■小机駅周辺:経路25


道路特定事業計画書【生活関連経路】						
経路名		県道横浜上麻生線、県道横浜生田				
事業区間		小机駅東側交差点～小机第259号線交点				
事業番号		【S-2-4】【S-2-6】【S-2-8】【S-2-9】				
事業延長		570m				
事業実施予定期間		2027年度～2028年度				
【整備方針】						
課題：【S-2-4】 排水施設の蓋の隙間が大きい。 【S-2-6】【S-2-8】【S-2-9】 視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。						
対策：【S-2-4】 排水施設の蓋を隙間が小さい規格に交換。 【S-2-6】【S-2-8】【S-2-9】 視覚障害者誘導用ブロックの設置。						
【事業内容】						
整備項目				事業量	箇所番号	備考
歩行空間の確保						
歩道の拡幅		m				
道路構造の改修						
車道の改修		m ²				
	歩道の改修	全面改修	m			
		部分改修	m ²			
		平坦性の改善	箇所			
		歩車道境界ブロックの改修	箇所			
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修						
	経路誘導の連続敷設	新設	m			
		改修	m			
	交差点等の部分敷設	新設	箇所	3	2,3,4	
		改修	箇所			
その他						
排水施設の蓋改修		箇所	1	1		
【事業実施に際して配慮すべき重要事項】						

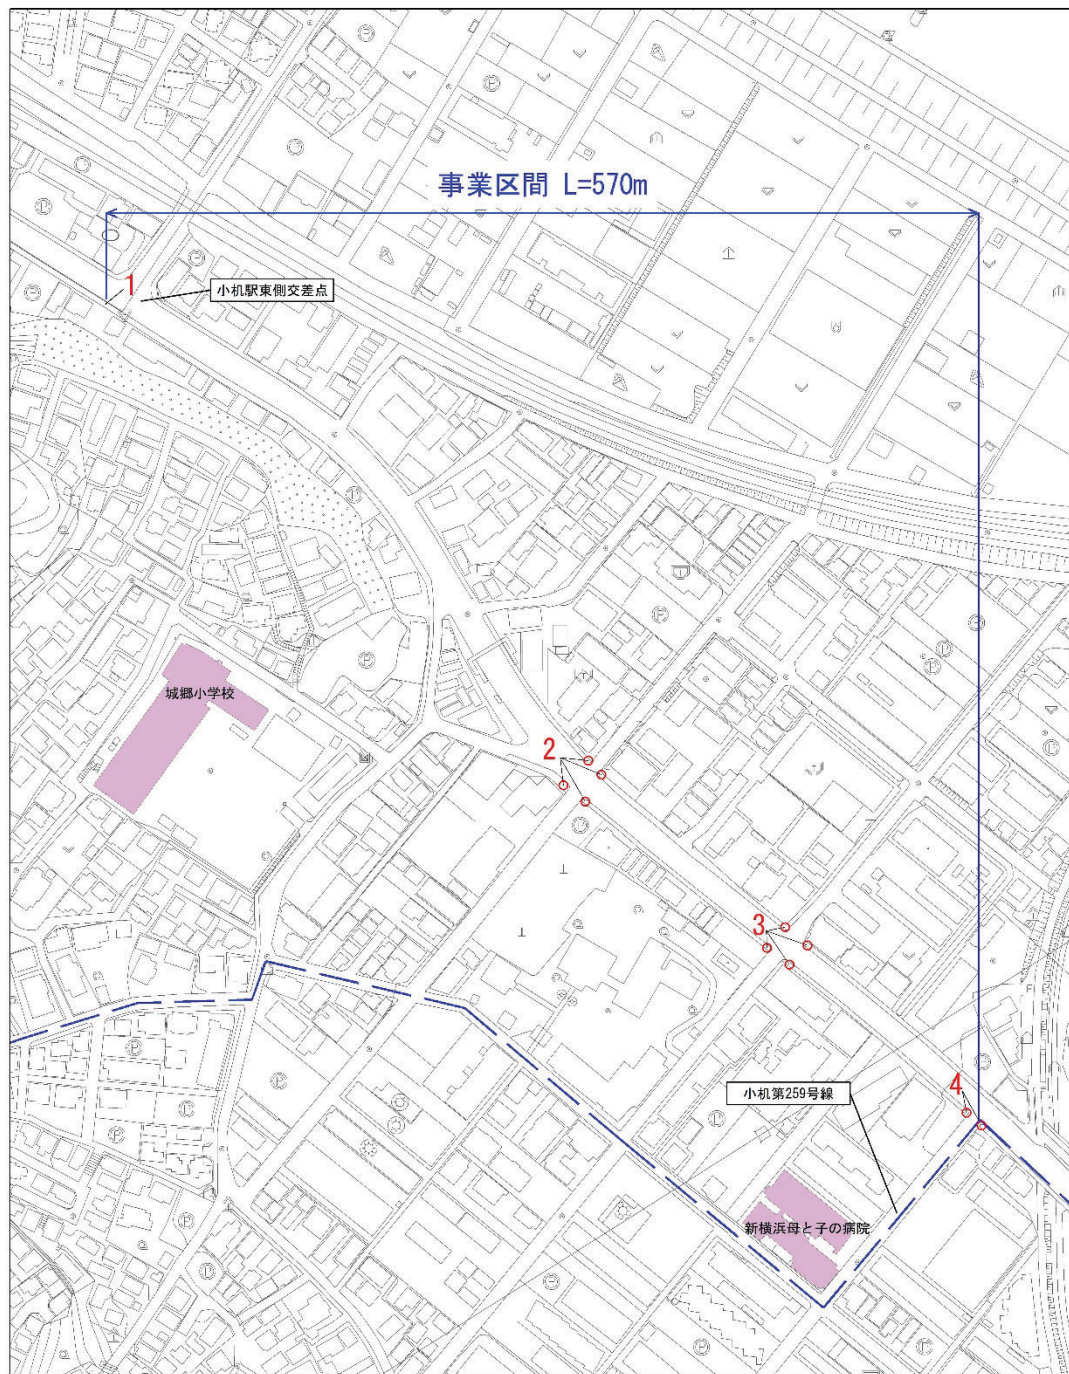

【横浜市建築局都市計画基本図データ（地図情報レベル2500）により作成】

■小机駅周辺:経路27

道路特定事業計画書【生活関連経路】						
経路名		小机第59号線				
事業区間		小机駅自由通路内				
事業番号		【S-2-10】				
事業延長		30m				
事業実施予定期間		2028年度				
【整備方針】						
課題: 北口側エレベーターに対しての案内が無く、位置が分かりにくい。						
対策: 案内板等の設置。						
【事業内容】						
整備項目				事業量	箇所番号	備考
歩行空間の確保						
歩道の拡幅		m				
道路構造の改修						
車道の改修		m ²				
歩道の改修	全面改修	m				
	部分改修	m ²				
	平坦性の改善	箇所				
	歩車道境界ブロックの改修	箇所				
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修						
経路誘導の連続敷設	新設	m				
	改修	m				
	交差点等の部分敷設	新設	箇所			
		改修	箇所			
その他						
案内板等の設置		箇所	1	1		
【事業実施に際して配慮すべき重要事項】						

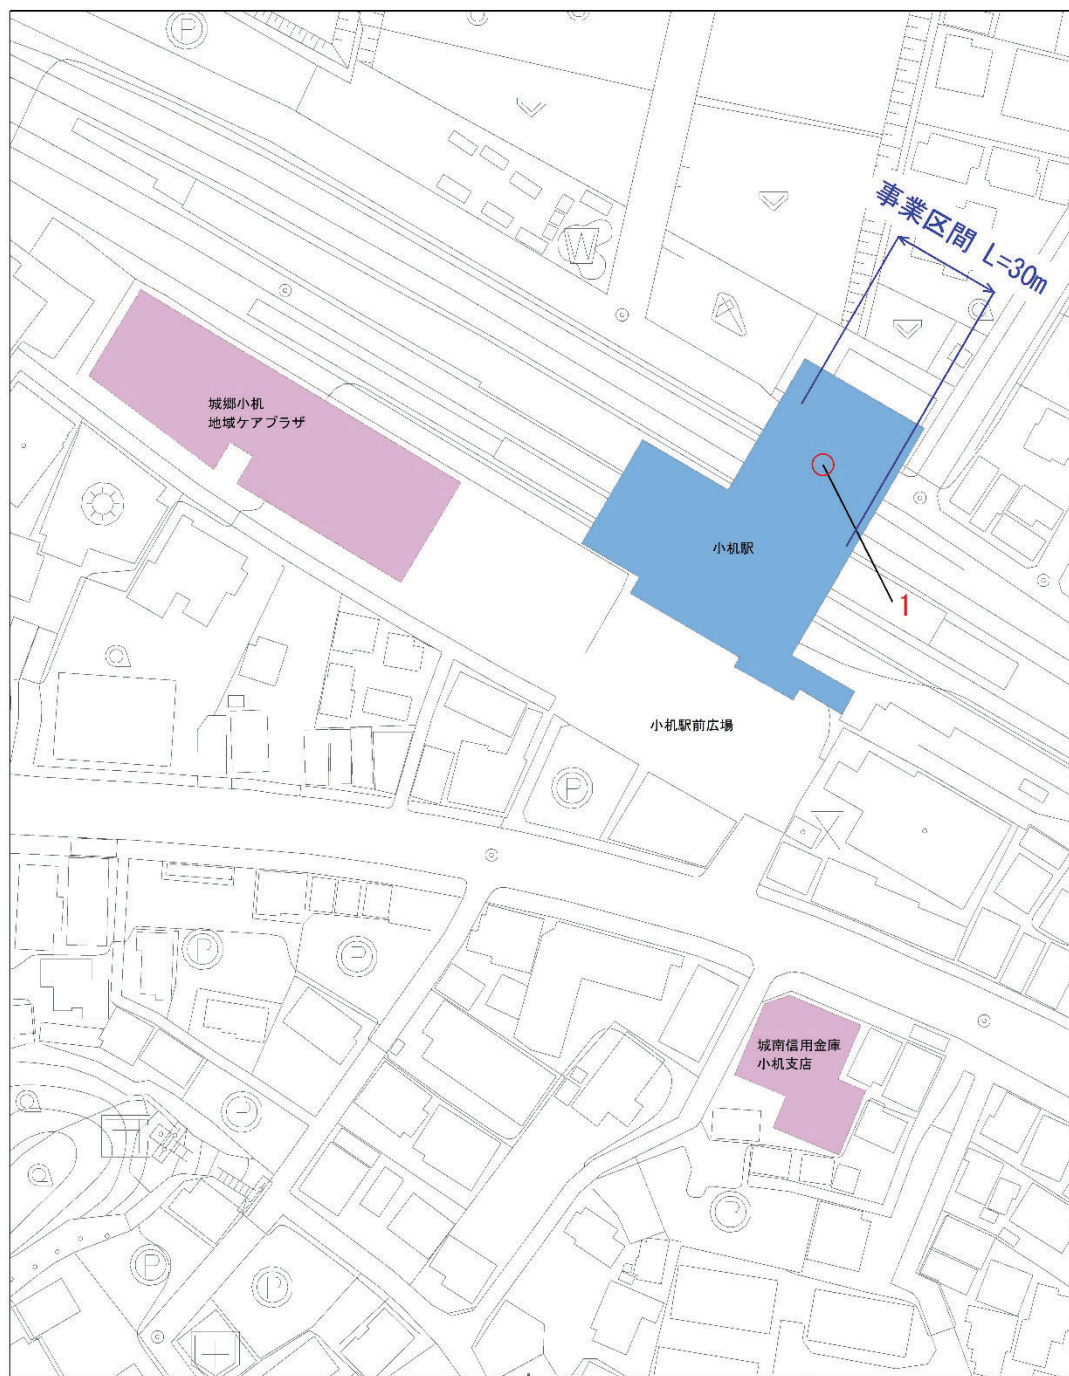

【凡例】


重点整備地区の区域 1 整備箇所



【横浜市建築局都市計画基本図データ（地図情報レベル2500）により作成】

■小机駅周辺:小机駅前広場

道路特定事業計画書【生活関連施設】						
経 路 名		小机駅前広場				
事 業 区 間		小机駅前広場				
事 業 番 号		【S-2-16】【S-2-17】【S-2-18】【S-2-19】【S-2-20】				
事 業 延 長						
事業実施予定期間		中期(～2033年度)				
【整備方針】						
課題:【S-2-16】バス停前の歩道にくぼみがある。						
【S-2-17】駅前広場内に段差がある。						
【S-2-18】駅前広場内の歩車道の区別がされていない。						
【S-2-19】駅前広場内の車両乗降場に屋根が無い。						
【S-2-20】駅前広場内の側溝に段差がある。						
対策:【S-2-16】平坦性の改善。						
【S-2-17】平坦性の改善。						
【S-2-18】歩車道境界を縁石で区別。						
【S-2-19】屋根付き乗降場の整備。						
【S-2-20】平坦性の改善。						
【事業内容】						
整備項目				事業量	箇所番号	備考
歩行空間の確保						
歩道の拡幅		m				
道路構造の改修						
車道の改修		m ²				
歩道の改修	全面改修	m				
	部分改修	m ²				
	平坦性の改善	箇所	3	1		
	歩車道境界ブロックの改修	箇所	1	1		
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修						
経路誘導の連続敷設	新設	m				
	改修	m				
交差点等の部分敷設	新設	箇所				
	改修	箇所				
その他						
乗降場の整備		箇所	1	1		
【事業実施に際して配慮すべき重要事項】						
上記事業の詳細に関しては道路局建設課にて検討。						

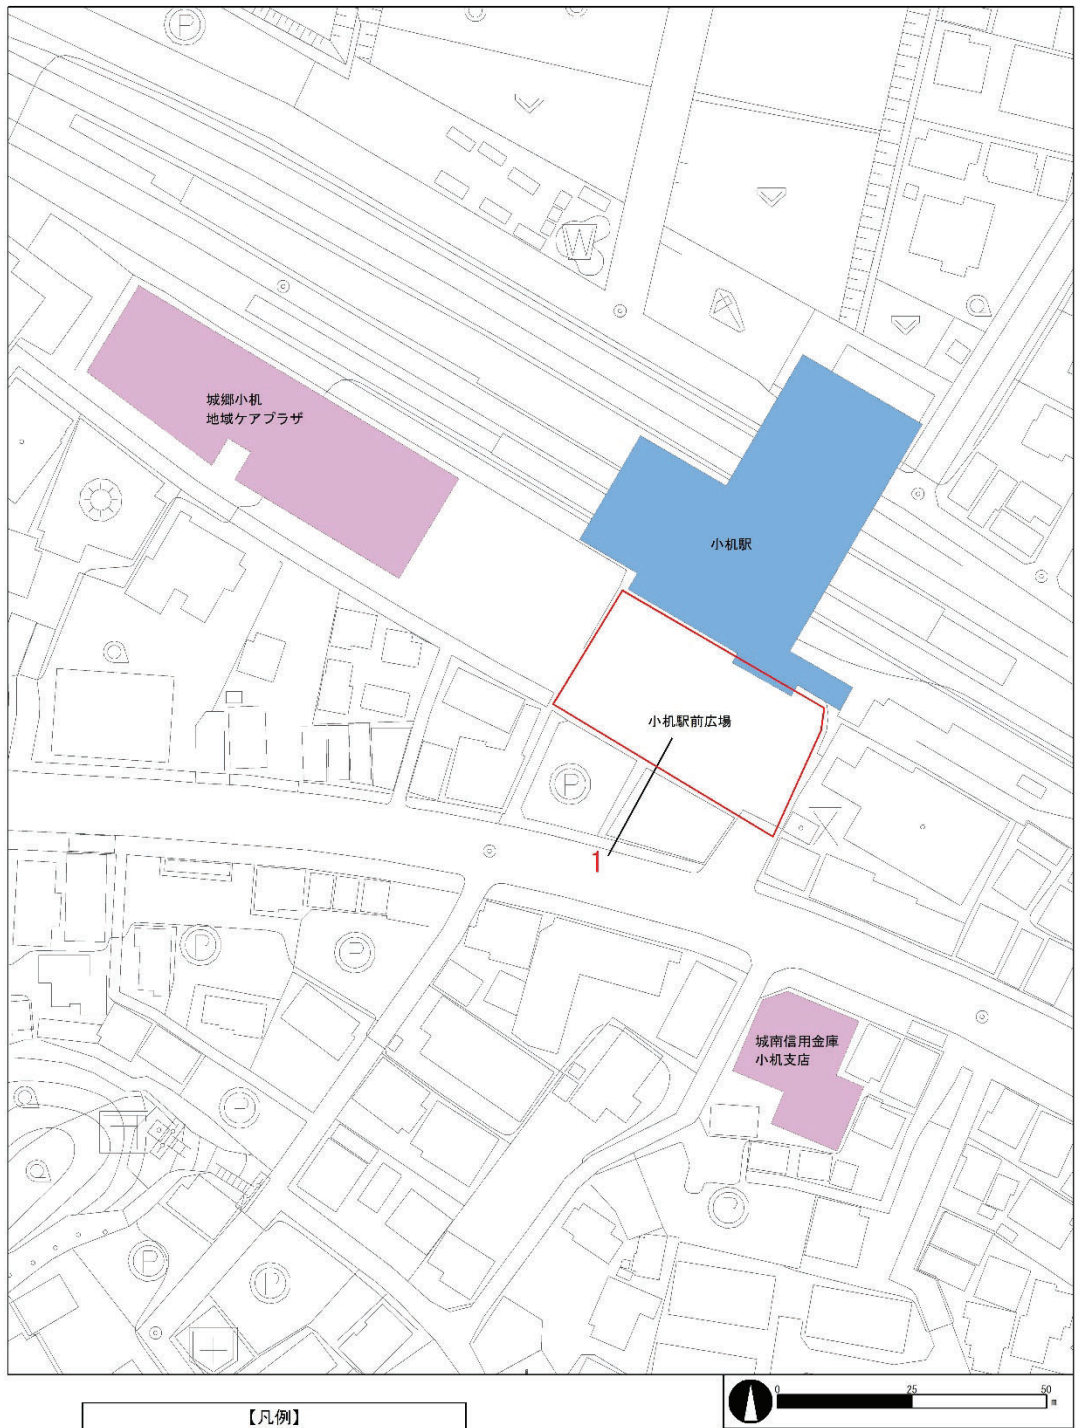

【凡例】

重点整備地区の区域

1 整備箇所

【横浜市建築局都市計画基本図データ（地図情報レベル2500）により作成】
