

平成 26 年度横浜市一般会計補正予算（第 5 号）
政策局関係部分の概要について

1 事業名、補正額及び財源 （単位：千円）

事業名	今回補正額	補正額の財源			
		国県支出金	市債	その他	一般財源
市大金沢八景キャンパスの耐震性等向上整備事業	▲300,000	0	▲220,000	0	▲80,000

2 補正理由

工法や機器仕様の見直し、工事箇所や数量の減、入札による差金、工事費減に伴う諸経費の減が発生したことなどにより、予算額と執行見込額との差額を減額補正します。

- 主な項目：①工法や機器仕様の見直し（空調機器等） ▲100 百万円
 ②工事箇所や数量の減（アスベスト撤去等） ▲116 百万円
 ③入札による差金 ▲25 百万円
 ④工事費減に伴う諸経費の減（工事監理費等）等 ▲59 百万円

【参考】市大金沢八景キャンパスの耐震性等向上整備事業の概要

- (1) 耐震基準を満たしていない校舎 4 棟（理科館、文科系研究棟、本校舎、附属校舎）について、耐震補強または建替工事を実施。（理学系研究棟は 25 年度末に完成）
 (2) 26 年度は、理学系研究棟（理科館）の改修工事、文科系研究棟の耐震補強工事、本校舎の耐震補強工事、学生交流センター（附属校舎）の新築工事を実施。（文科系研究棟は、26 年 11 月に完成）

＜スケジュール表＞


校舎	24年度	25年度	26年度	27年度
理学系研究棟 (理科館を建替)	H24.9着工	H26.2完成	仮使用に伴う改修工事1	仮使用に伴う改修工事2
文科系研究棟 (耐震補強)		H26.4着工、H26.11完成	耐震補強工事	
本校舎 (耐震補強)			H26.12着工	H27.12完成
学生交流センター (附属校舎を建替)			H26.9着工	H28.1完成

(3) 予算執行状況 （単位：百万円）

		26年度予算	27年度予算案	合計
文科系研究棟	工事費予算額	1,336	2,041	3,377
耐震補強工事ほか (26年度着手分)	契約額(支払見込額)	1,036	2,041	3,077
	差引	300	0	300

（裏面あり）

(4) 市大八景キャンパス 校舎配置図

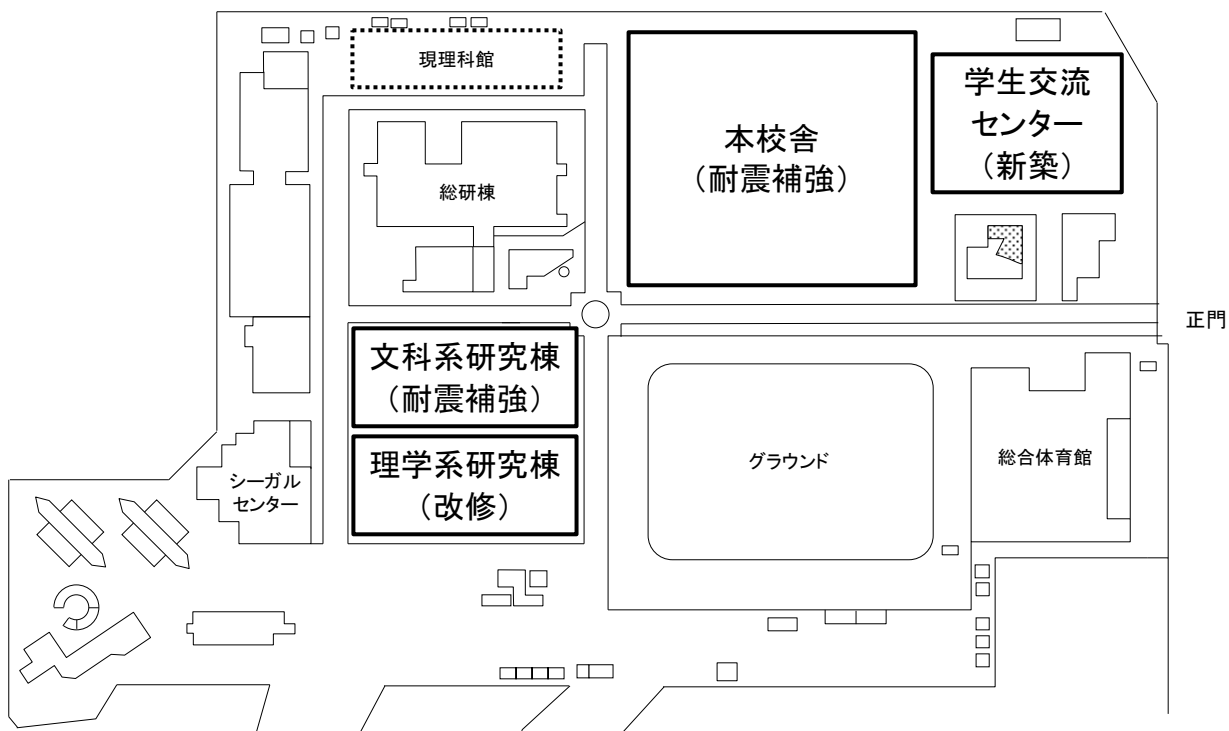

※太枠が 26 年度に工事を行う校舎

○理学系研究棟の使用状況

平成 25 年度末 しゅん工

平成 26 年度 4～11 月 文科系研究棟の仮移転先として使用

12 月～ 本校舎の仮移転先として使用

平成 27 年度 引き続き、本校舎の仮移転先として使用

平成 28 年度 理学系研究棟としての本使用を開始
