

横浜市ウェブサイト再構築の取り組み状況について

1 業務の概要

(1) 市ウェブサイトの現状と課題

ア 各区局統括本部ごとにサイト管理・運用を行っているため、内容の重複したページが公開されているなど、情報が探しづらい

イ 全体で約 14 万ページあるウェブページのうち、約 10 万ページが管理されていない

ウ スマートフォン等の新しい機器や、ウェブアクセシビリティ JIS 規格※₁に対応できていない

※₁：ウェブアクセシビリティ J I S 規格とは、高齢者や障害者を含めて、誰もがホームページの情報や機能を支障なく使えるように、国が定めた基準

(2) 業務の目的

上記の課題を解決するため、ウェブページの情報データベース化し、各区局統括本部がそれぞれ管理しているサイトを一元化することで課題の解決を図ります。また、オープンデータの基盤整備にも対応します。

(3) 26 年度と 27 年度の業務経費

ア 合計契約額：213,340 千円

(うち、システム開発請負事業者との契約額：114,966 千円)

イ 支出済額：178,024 千円

(うち、システム開発請負事業者への支出済額：79,650 千円)

ウ 繰越額：35,316 千円

2 システム開発請負事業者との業務経過


(1) 業務開始から技術的問題の報告を受けるまで

26 年度は、新しい CMS ※₂ を調達し、9 月からその設計に係る作業に着手しました。

※₂：CMS とはウェブ・コンテンツ・マネジメント・システムの略称で、文章、画像等のウェブサイトを構成する情報コンテンツを管理するシステム

27 年度は、26 年度に作業した設計をもとに CMS の構築を委託しました。しかし、平成 27 年 12 月に、請負事業者から「技術的問題の発生」について報告を受けたため、作業は一時停止となりました。

(2) 技術的問題の報告を受けてから現在まで

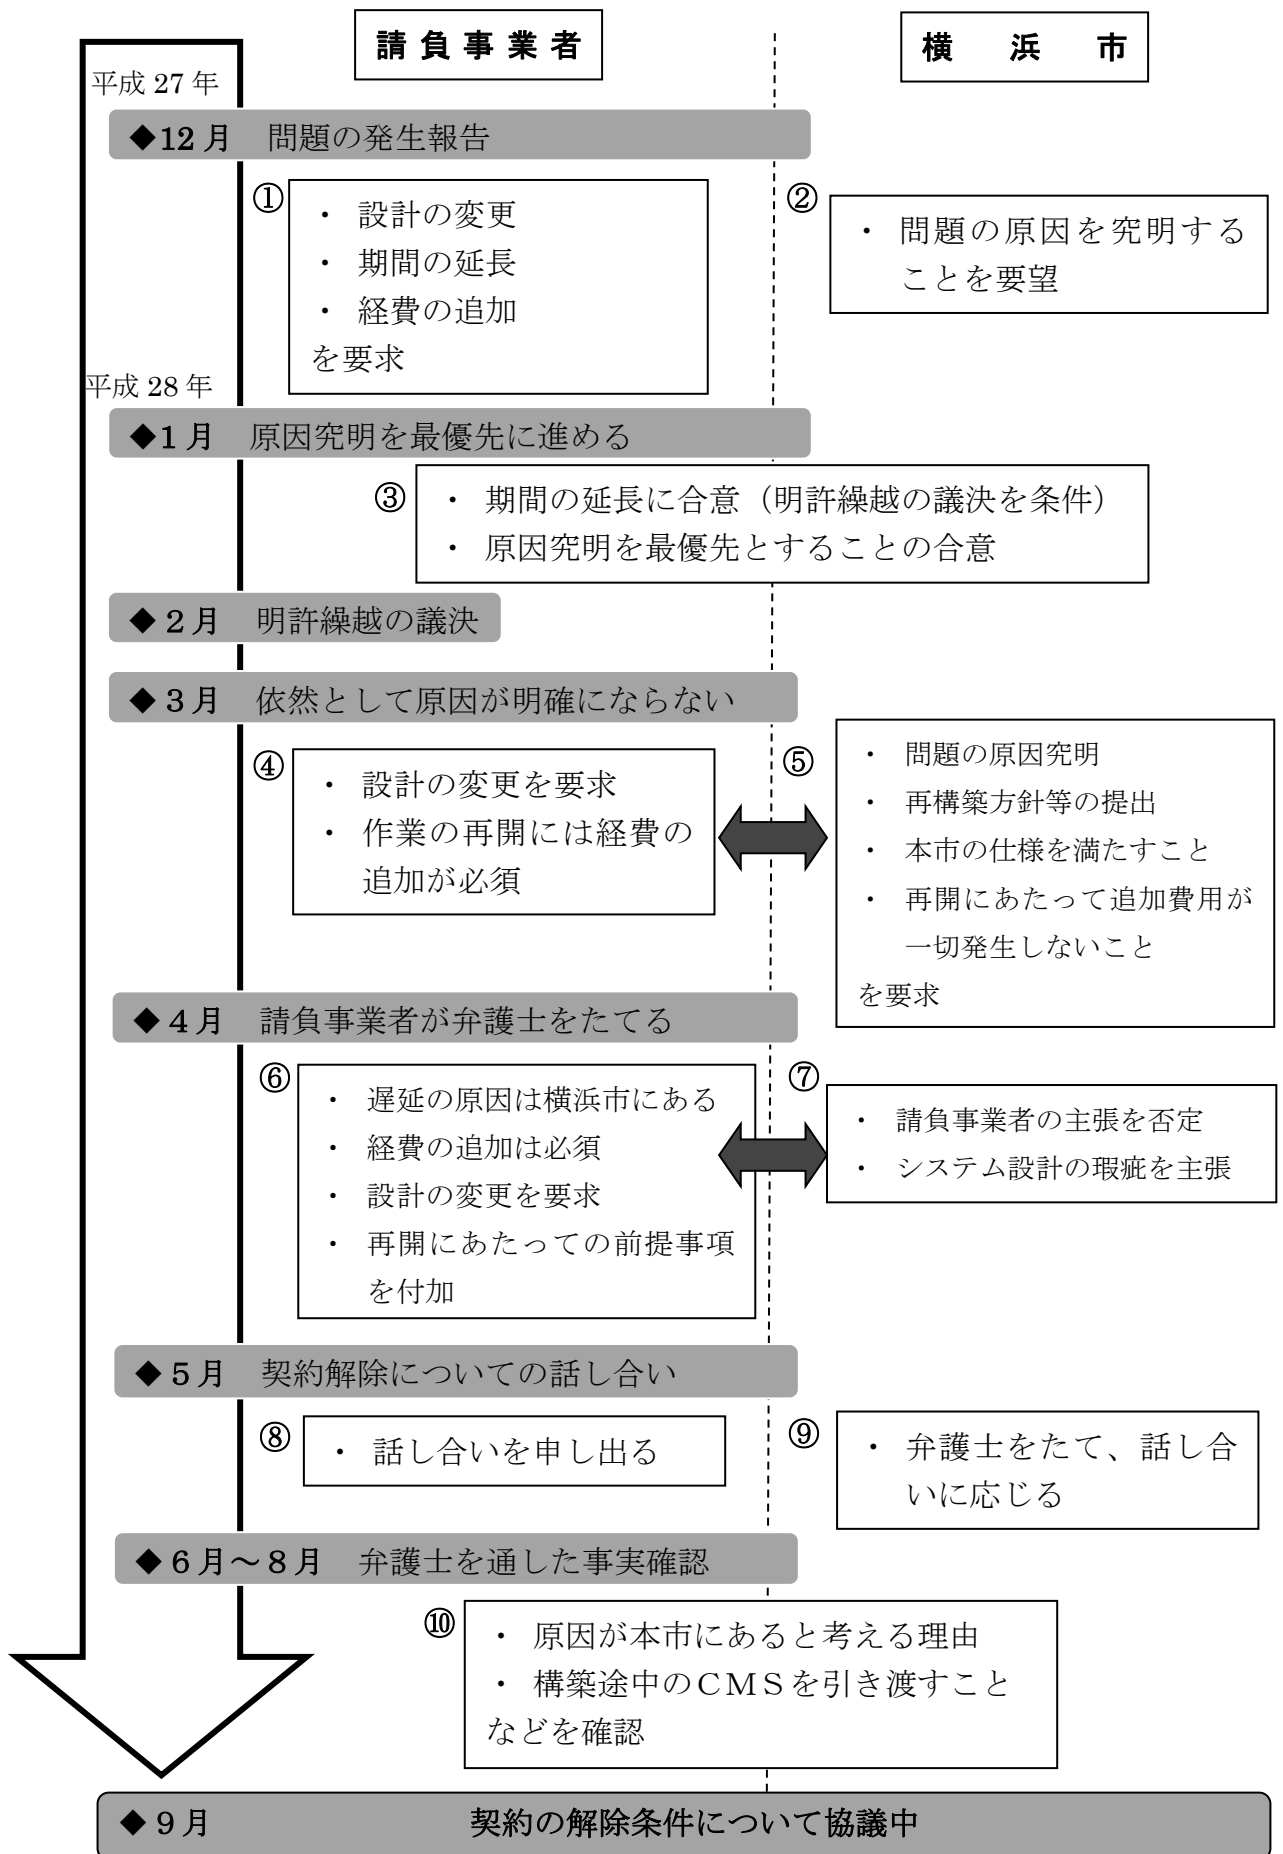

3 今後の進め方

請負事業者との協議結果及び、それを踏まえた市ウェブサイト再構築の今後の進め方について、発注方法、仕様、進捗管理の方法など、様々な視点で検証を行ったうえで、改めて市会に御報告させていただきます。
